


Bryggen i Bergen - Istandsette bygninger og overordna tilstandsgrad

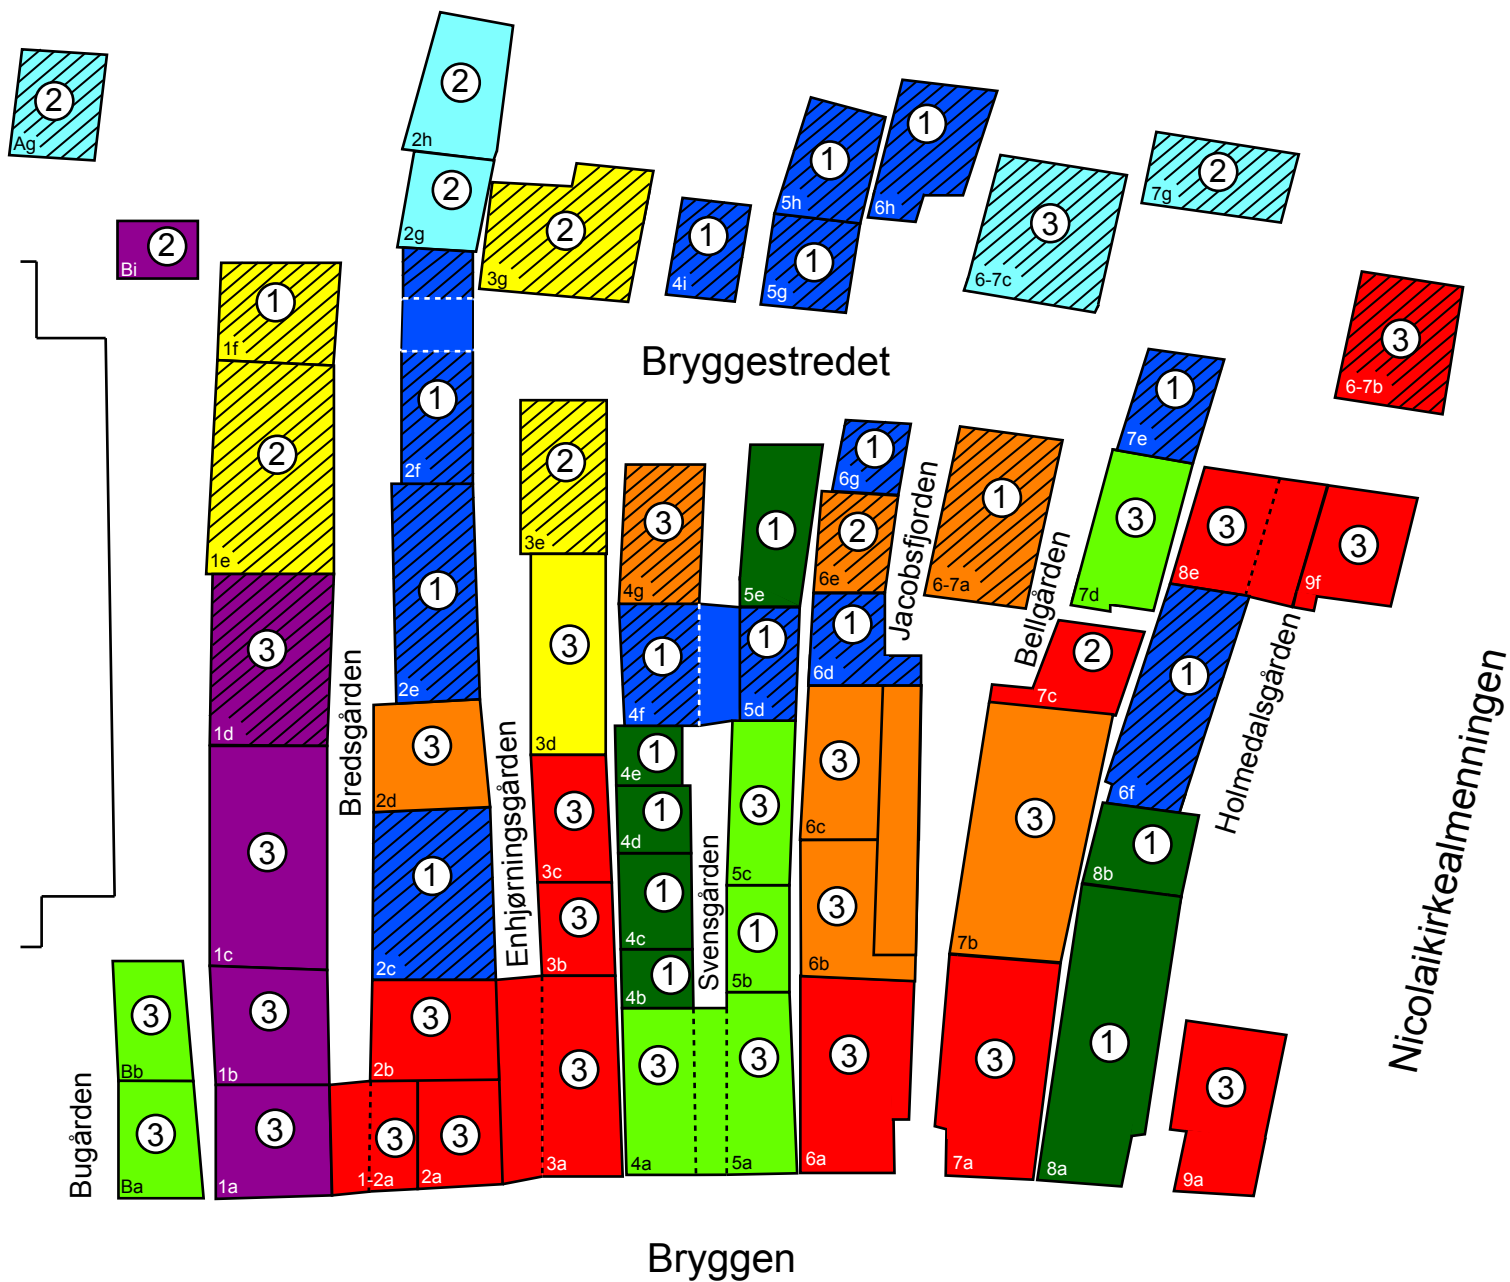

	Istandsette bygninger 1962 - 2000
	Ferdig istandsett i PB
	Under istandsetting i PB
Tilstandsregistrering 2010	
	Bygninger med mindre skadar og små istandsettingsbehov
	Stabile bygninger men med større skadar og istandsettingsbehov
	Bygninger med akslerende forfall på grunn av setningar i grunnen
	Bygninger med akslerende forfall på grunn av opprotning av bolverk eller fuktproblematikk
	Tilstandsregistrering 2011
	Tilstandsregistrering 2012
Tilstandsgradar: *	
1	= ordinært vedlikeholdsbehov
2	= moderate utbetringar naudsynt
3	= store utbetringar naudsynt
* Merk at ein dårleg tilstandsgrad ikkje treng bety at ein bygning må settast i stand, men kan vere knytt til tilfelle som ein taklekkasje, brann-tekniske manglar, insektskadar, manglande kledning mv.	

Prosjekt Bryggen 2014 - Tilskot fordelt av Hordaland fylkeskommune

Prosj.nr	Askeladden ID	Delprosjekt	Søkar/ utførande	Omsøkt beløp 2014	Overførte midlar frå 2013	Tilskot 2014, inkl førehands-tilsegn	Budsjett 2014 inkl overførte midlar
PB-100		Istandsetting					
PB-102		Holmedalsgården, bygn 8a og 8b	Stiftelsen Bryggen (SB)				
PB-102.1	8a: 87138-1				333 700	0	333 700
PB-102.2	8b: 87138-4				141 300	0	141 300
				0	475 000	0	475 000
PB-104		Svensgården, bygn 4a-d og 5a-c	Vats AS				
PB-104.1	4a: 87166-1			121 275	236 813	13 500	250 313
PB-104.2	4b: 87166-2			0	256 600	0	256 600
PB-104.3	4c: 87166-3			286 920		286 950	286 920
PB-104.4	4d: 87166-4			286 920		286 850	286 920
PB-104.5	5a: 87166-9			4 794 500	997 646	726 000	1 723 646
PB-104.6	5b: 87166-10			1 451 475		1 450 700	1 450 700
				6 941 090	1 491 059	2 764 000	4 255 099
PB-106		Bellgården, bygning 7d	Bellgården AS				
PB-106	87121-4			4 840 417	0	4 800 000	4 800 000
				4 840 417	0	4 800 000	4 800 000
PB-108		Bugården, bygning Ba og Bb	SB				
PB-108.1	Ba: 87126-1			5 435 910	0	5 300 000	5 300 000
PB-108.2	Bb: 87126-2			3 749 045	0	3 200 000	3 200 000
				9 184 955	0	8 500 000	8 500 000
		Midlar som disponerast seinare i 2014			0	2 163 335	2 163 335
						2 163 335	2 163 335
Totalt				20 966 462	1 966 059	16 064 000	20 193 434
PB-200	Askeladden ID	Sikring og prosjektering	Søkar/ utførande	Omsøkt beløp	Overførte midlar frå 2013	Tilskot 2014	Budsjett 2014 inkl overførte midlar
PB-205.1		Felles brannsikring: Gradvis fornying av sprinklaranlegget	SB på vegne av alle	97 983	0	97 000	97 000
PB-207		Sikring bygninger, ikkje spesifisert		0	0	0	0
PB-213		Brannrisikoanalyse		0	271 338	150 000	421 338
PB-214	4g: 87166-7	Bygning 4g (snekkerverkstedet); reparasjon av råteskade	SB	380 880	0	380 000	380 000
PB-215	6-7c: 90851-2	Bygning 6-7c (steinkjeller); reparere murverk og puss på vest- og østfasade. Dreneringsgrøft øst	SB	536 229	0	530 000	530 000
		Bygning 5d (Putterstuen); reparasjon av råteskade	SB	67 221	0		0
		Bygning 6-7b (stolpehuset); forprosjekt	SB	253 100	0	0	0
		Bygning 6b; forprosjekt for istandsettelse		300 000	0	0	0
Totalt				1 635 413	271 338	1 157 000	1 428 338
PB-500		Fellesoppgåver	Søkar/ utførande	Omsøkt beløp	Overførte midlar frå 2013	Tilskot 2014	Budsjett 2014 inkl overførte midlar
PB-501		Driftsoppgåver	SB	565 000	0	370 000	370 000
PB-502		Materialbank	SB	408 036	0	408 000	408 000
PB-505		Tilstandsvurdering	HFK		23 195	26 805	50 000
Totalt				973 036	23 195	804 805	828 000
DELSUM				23 574 911	2 260 592	18 025 805	22 449 772

Prosjekt Bryggen 2013 - Tilskot fordelt av Hordaland fylkeskommune

Prosj.nr	Delprosjekt	Søkar/ utførande	Tilskot 2013	Utbetaling 2013 og vinter 2014	Overførast til budsjett 2014	Merknad
PB-100	Istandsetting					
PB-102	Holmedalsgården, bygn 8a og 8b	Stiftelsen Bryggen (SB)				
PB-102.1	Bygning 8a		3 010 000	2 676 300	333 700	Ferdig istandsatt haust 2013
PB-102.2	Bygning 8b		690 000	548 700	141 300	Ferdig istandsatt haust 2013
			3 700 000	3 225 000	475 000	
PB-104	Svensgården, bygn 4a-d og 5a-c	Vats AS				
PB-104.1	Bygning 4a		306 000	68 962	237 038	
PB-104.2	Bygning 4b		262 000	5 400	256 600	Ferdig istandsatt "fase 2" i 2012
PB-104.3	Bygning 4c		362 000	501 914	-139 914	Ferdig istandsatt "fase 2" i 2013
PB-104.4	Bygning 4d		324 000	370 258	-46 258	Ferdig istandsatt "fase 2" i 2013
PB-104.5	Bygning 5a		2 214 500	1 188 289	1 026 211	
PB-104.6	Bygning 5b		1 218 000	1 068 628	149 372	
PB-104.7	Bygning 5c		13 500	5 490	8 010	
			4 700 000	3 208 941	1 491 059	
PB-106	Bellgården, bygning 7d	Bellgården AS				
PB-106	Bygning 7d		7 500 000	7 500 000	0	
			7 500 000	7 500 000	0	
PB-108	Bugården, bygning Ba og Bb	SB				
PB-108.1			1 850 000	1 850 000	0	
PB-108.2			1 850 000	1 850 000	0	
			3 700 000	3 700 000	0	
Totalt			19 600 000	17 633 941	1 966 059	
PB-200	Sikring og prosjektering	Søkar/ utførande	Tilskot 2013	Utbetalt 2013	Overførast til 2014	Merknad
PB-205.1	Felles brannsikring: Gradvis fornying av sprinklaranlegget	SB på vegne av alle	590 000	590 000	0	
PB-207	Sikring bygninger, ikkje spesifisert		271 338	0	271 338	
Totalt			861 338	590 000	271 338	
PB-500	Fellesoppgåver	Søkar/ utførande	Tilskot 2013	Utbetalt	Overførast til 2014	Merknad
PB-501	Driftsoppgåver	SB	300 000	300 000	0	
PB-502	Materialbank	SB	340 000	340 000	0	
PB-505	Tilstandsvurdering	HFK og konsulent	165 974	142 779	23 195	
Totalt			805 974	782 779	23 195	
SUM			21 267 312	19 006 720	2 260 592	
