





Statusrapport Haugalandspakken des. 2016

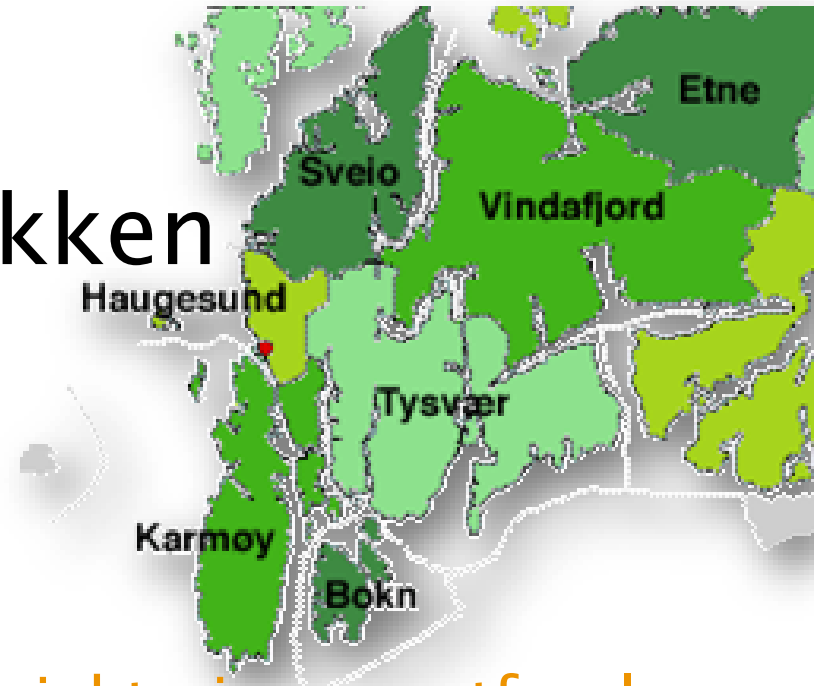

Pågående prosjekter.

1. Prosjekter under prosjektering og utførelse.
2. Prosjekter under planlegging.

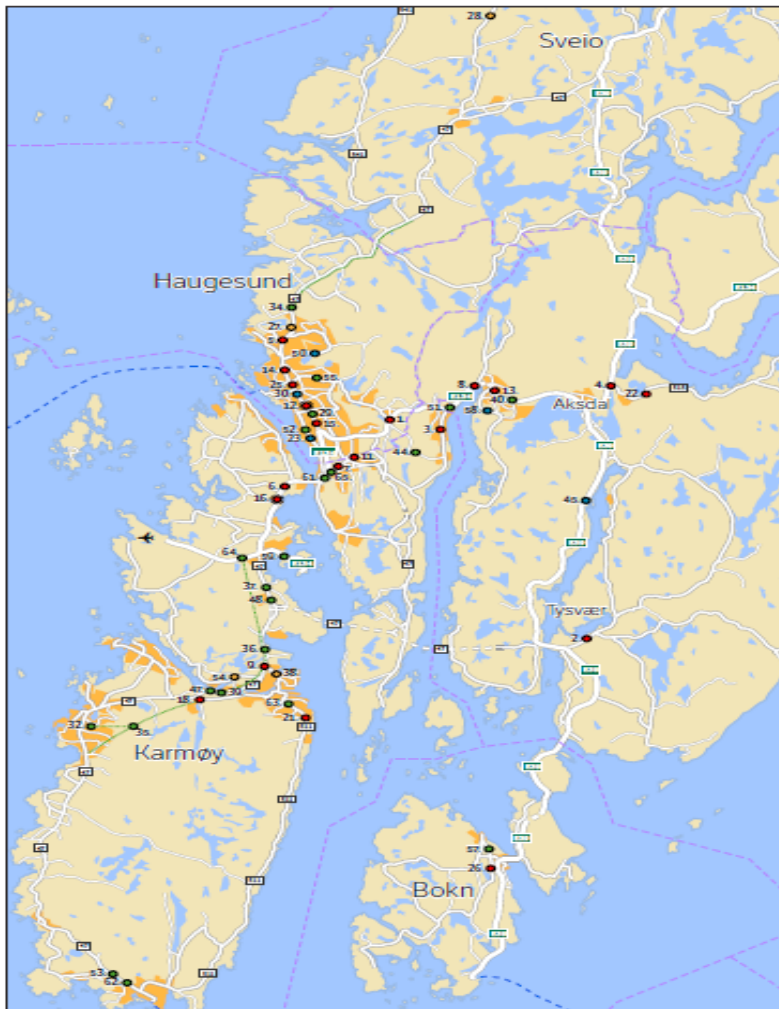

Mai 2016

Ferdig byggt Under planlegging Under bygging Ikke startet Run planer



Statens vegvesen

Oversikt over prosjekt i Haugalandspakken

Veier Prosjektnavn Kommune Tilbak Byggestart Ferdig

FERDIGE PROSJEKTER

STORE PROSJEKTER						
1	1334	Ny veie 58 Årøsdalen	Haugesund	Nyveitbedring/Topplanering	2005	2006
2	Pv.776	Havningsvegen (Tjøstapp - Sandvik)	Tysvær	Ny veg	2006	2007
3	Pv.820	Sleivvegen	Karmøy	Utbedring	2007	2008
4	1334	Gimdeløysveit	Tysvær	Nyveitbedring/Rundkjøring	2008	2009
5	Pv.47	Kringhaugvegen - Auklandsvægen	Haugesund	Finforbedring	2009	2010
6	Pv.47	Bakveit	Karmøy	Nyveitbedring/Rundkjøring	2011	2012
7	Pv.47	Northen - Ragsleryr	Haugesund	Ny omkjøring/veg	2011	2012
8	1334	Fjærevolden	Tysvær	Nyveitbedring/Topplanering	2012	2014
9	Pv.47	Sjygneløysveit	Karmøy	Nyveitbedring/Rundkjøring	2013	2015
10	1334	Sjøkjeld - Sothorn	Vindafjord	Ny base med midtkjøring, 1. etasje og 2. etasje	2013	2015
11	Pv.47	Raggjerd 4-kelt	Haugesund	Utbedring	2014	2015
12	Pv.47	Normannsdalenplan Karmundgata	Haugesund	Utbedring	Run planlegging	
13	1334	Fjærevolden	Tysvær	Nyveitbedring/Topplanering	2013	2016

PROGRAMOMRÅDER

TS						
14	Pv.47	Karmundgata - Fjærevolden	Haugesund	TS-tiltak, undergang	2008	
15	Pv.47	Normannsdalenplan Karmundgata	Haugesund	TS-tiltak, undergang	2006	2008
16	Pv.47	Ny veie undergang på Rått og Råttveit	Karmøy	Bygging undergang, Rått og Råttveit	Run planlegging	
17	1334/1334	Ny veie Fjærevolden	Vindafjord	TS-tiltak utbedring kryss	2014	2015

GIS-VEG

18	Pv.47	Drivveie - Voss	Karmøy	GIS-veg	2009	
19	1334	Sjøkjeld (veitrom)	Vindafjord	Portau og GIS-veg	2007	2008
20	Pv.840	Hålandsvægen - Haukevegen	Karmøy	GIS-veg	2010	
21	Pv.513	Lugene - Auksten	Karmøy	Portau og GIS-veg	2011	2012
22	Pv.515	Gierhaug - Sævik	Tysvær	GIS-veg	2012	2014
23	Pv.523	Selhuvevegen	Haugesund	Portau	2012	2012
24	Pv.762	Østvege - Raa	Vindafjord	GIS-veg	2012	2012

ROLLETTIV

25	Pv.47	Karmundgata - Fjærevolden	Haugesund	Rullebane	2010	
----	-------	---------------------------	-----------	-----------	------	--

SMÅERE UTBEDRINGE R

26	Pv.850	Fjærevolden	Bokn	Utbedring	2011	2012
----	--------	-------------	------	-----------	------	------

PROSJEKT UNDER PLANLEGGING/BYGGING

STORE PROSJEKTER

27	Pv.47	Røala - Fagerheim	Haugesund	Nyhovedveg Haugesund nord	2010	
28	Pv.5	Buemyr - Gimdelvold	Sveio	Utbedring av eks. veg	2013	
29	Pv.47	Karmundgata (Etnedal - Gjørdalen)	Haugesund	Finforbedring med portau og GIS-veg/tiltak	2014	
30	Pv.47	Karmundgata (Haugesund - Røala)	Haugesund	Finforbedring med portau og GIS-veg/tiltak	0	
31	1334	Østvege	Vindafjord	Utbedring Østvege veitrom	2014	
32	Pv.47	Fingvegen	Karmøy	Del av Raa veie - Veikrossen, omkjøring/veg	2015	
33	1334	Fagerheimdøringene	Vindafjord	GIS-veg	2015	
34	Pv.47	Fagerheim - Østvege	Haugesund	Nyhovedveg Haugesund nord - Sveio	2017	
35	Pv.47	Raa veie - Veikrossen	Karmøy	Omkjøring/veg/Utbedring	2015	
36	Pv.47	Etde - T-forkningsfeltet av RDP Veikrossen E.Ø.Ø	Karmøy	Nyhovedveg	2019	
37	Pv.47	T-forkningsfeltet - Auksten	Karmøy	Nyhovedveg	0	
38	Pv.513	Sjygneløysvegen - Sjøkjeld	Karmøy	GIS-veg	2016	
39	Pv.47	Veikrossen - Etde	Karmøy	Nyhovedveg	2017	
40	1334	Aloldal - Haugesund (Fjærevolden)	Tysvær	Nyveitbedring/Rundkjøring	0	
41	1334	Østen - Østvege	Vindafjord	Ny gang- og sykkelveg	2016	
42	1334	Østen	Vindafjord	Sikringsforbedring, portau lenge E.Ø.Ø	2016	
43	1334	Østvege	Vindafjord	Overens prosjekt	2016	
44	Pv.528	Fingvegen	Karmøy	Utbedring av eks. veg	2017	
45	Pv.529	Aloldal - Østvege	Tysvær	Ny gang- og sykkelveg	2017	
46	Pv.47	RDP Veikrossen - Fjærevolden	Karmøy	Østvege	0	
47	Pv.523	Northen 4-kelt	Karmøy	Østvege	0	

TS

48	1334	Etnedal veitrom	Etnedal	Portau lenge E.Ø.Ø	2017	
49	Pv.47	Stubbene	Karmøy	Hyvendinger og/veitrom	2017	
50	Pv.47	Mjøllendøringene	Karmøy	Hyvendinger og/veitrom	2017	
51	1334	Mjøllendøringene	Etnedal	Ombygging av kryss	2017	
52	Pv.524	Sleivvegen - Auklandsvægen	Haugesund	Midre TS-tiltak på strøking	2017	
53	1334	Sleivvegen	Tysvær	Sleivvegen lenge E.Ø.Ø	2017	

GIS-VEG

54	Pv.523	Selhuvevegen	Haugesund	Sykkelstøt og portau	2017	
55	Pv.47	Sleivvegen - Råttveit	Karmøy	GIS-veg	2019	
56	Pv.851	Sundvegen	Karmøy	GIS-veg	2016	
57	Pv.528	Sjøkjeldvegen	Haugesund	TS-tiltak, GIS-tiltak	2017	
58	1334	Etnedal - Østvege	Etnedal	Ny gang- og sykkelveg	2016	
59	Pv.850	Fjærevolden	Bokn	Gang- og sykkelveg/Portau	2016	
60	Pv.771	Fjærevolden - Løstvege (Fjærevolden)	Tysvær	Ny gang- og sykkelveg	2017	
61	1334	Havningsvegen	Karmøy	Ny gang- og sykkelveg	2017	
62	Pv.734	Northen - Haugesund	Vindafjord	Ny gang- og sykkelveg	2017	
63	1334	Northen - Haugesund	Karmøy	Ny gang- og sykkelveg	2017	
64	Pv.47	Sleivvegen - Østvege - X	Karmøy	Portau	2016	
65	Pv.513	Auksten - Sjygneløysvegen	Karmøy	Ny gang- og sykkelveg	2017	

09.12.2016

Statens vegvesen

Haugalandspakken



Statens vegvesen

Finanser pr nov 2016

- På konto 580 mill kr.
- *Rekvirert fra Haugalandspakken as i 2016*
 - *Fylkesvei 89 mill kr.pr 16.11.16.*
 - *Riksvei 83 mill kr. Pr 16.11.16.*
 - *totalt rekvirert 172 mill kr. Pr 16.11.16.*
- *Rekviret Haugalandspakken as 2008 -2016 .1150 mill*
- *Forventa årlig omsetning 2017 - 2023*

Omsetning	2017	2018	2019	220	2021	2022	2023	Sum <u>mill kr.</u>
Med takstauke	300	400	500	600	800	600	500	3700
Uten takstauke	300	200	250	300	300	300	250	1900



Haugalandspakken

Prosjekt med forventet byggestart i 2017:

- Fv.511 Bygnes – Søylebøtn, ny G/S veg samt delvis ny veg. (Karmøy)
 - Fv.511 Åsebøen – Stangeland. To sidig fortau. (Karmøy)
 - Fv.923 Salhusveien. Sykkelfelt 1 byggetrinn i Karmøy.
 - Fv.923 Salhusveien – Norheim–Omkjøringveien (Karmøy)
 - E134 Ølen – Ølensvåg, ny G/S veg. (Vindafjord)
 - Fv.834 Håkull – Trovåg G/S veg (Vindafjord)
 - Fv.890 Føresvikvegen, Utbedring av veg samt fortau. (Bokn)
 - Kollektivtiltak.
- Investering ca 300 mill kr



Status pågående prosjekter.

Prosjekter under prosjektering og utførelse

Kollektivtiltak Haugalandet

Tiltak: *Utbedring av holdeplasser, nye busslommer og nye sykkelkurer.*

- Prosjekta er finansiert av fylkesvegbudsjett, riksvegbudsjett og Haugalandspakken.
- Oppgradering skjer fortløpende over hele året.
- Bruker 5 – 10 mill pr år.




Status pågående prosjekter.

Prosjekter under prosjektering og utførelse

Fv. 47 Kvala – Fagerheim (*Haugesund kommune*)

Tiltak: *Firefeltsveg i ny trasé med miljøtunell G/S og parkbru.*

- Byggetid 2 år.
- Kostnad 278 mill. 2015–kr.
- Arbeidet går som planlagt
- Ferdigstillelse høst 2017
- God framdrift og i henhold til budsjett.
- HMS: 1 registrert skade med fråvær.(9 dager)
- Arbeid med Kvalaelv bru og miljøkulvert pågår.
- Lærlinger: 4 stk

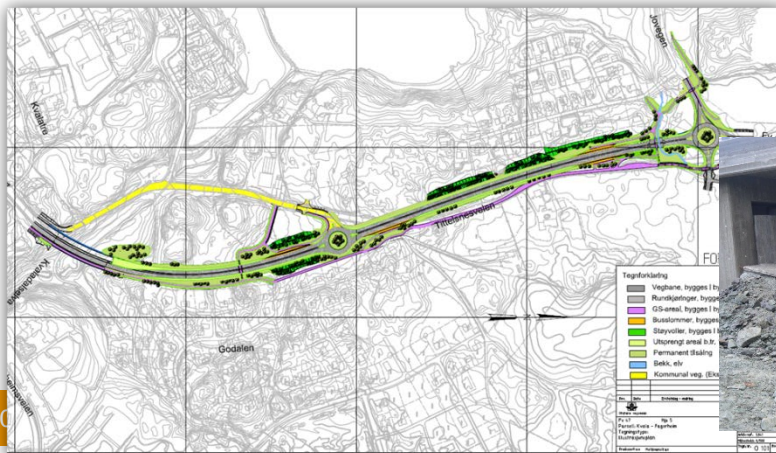


Status pågående prosjekter.

Prosjekter under prosjektering og utførelse

Fv. 6 Buamy – Grimstveit (Sveio kommune)

Tiltak: *Utbedring av eksisterende veg med gjennomgående sykkeløsning.*

- Prosjektet er under bygging.
- God fremdrift innenfor budsjetterte rammer
- Trafikk på veien mai 2017.
- Ferdigstillelse aug. 2017.
- Ingen registrerte HMS fravik
- Lærlinger: 1

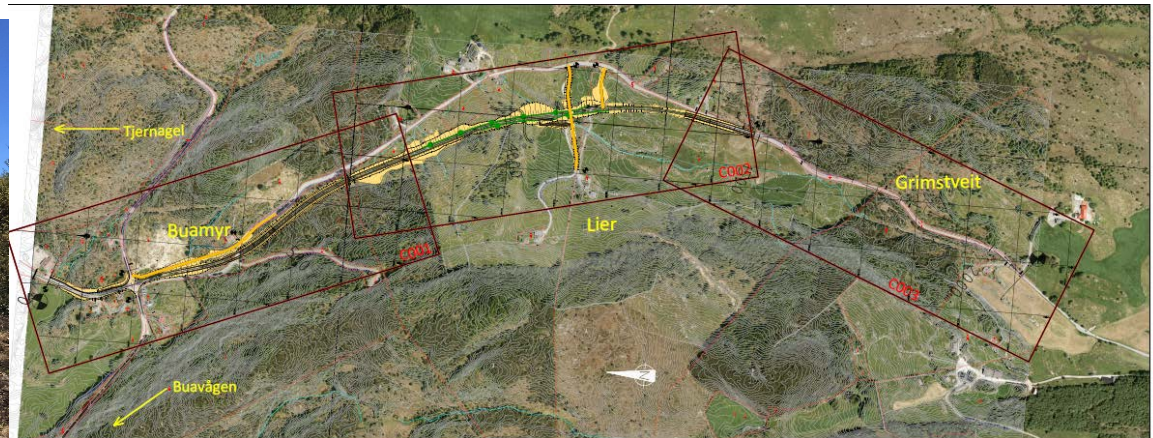

Status pågående prosjekter.

Prosjekter under prosjektering og utførelse

Fv.851 Sundvegen (Karmøy kommune)

Tiltak: *Gang- og sykkelveg på ca. 2,5 km.*

- Anleggsarbeidet er igang.
- Arbeidet i henhold til revidert budsjett (47 mill)
- Ferdigstillelse sommer 2017
- HMS ingen registrerte avvik
- Risa er hovedentreprenør
- Blindsoner kampanje på barneskulen
- God dialog med Karmøy kommune
- God motagelse i bygda.
- Lærlinger: 1





Status pågående prosjekter.

Prosjekter under prosjektering og utførelse

E134 Etne– Steine (*Etne kommune*)

Tiltak: *Gang- og sykkelveg langs E134*

- Anleggsarbeidet er igang.
- Prosjektet har en bevilgning på 10 mill.kr statlig midler og 6 mill.kr fra Haugalandspakken.





Status pågående prosjekter. Prosjekter under prosjektering og utførelse

E134 Fortau gjennom Etne sentrum *(Etne kommune)*

Tiltak: *Fortau langs E134*

- Konkurransesgrunnlag er klar.
- Avsatt midler til prosjektet fra Haugalandspakken 2 mill.kr.
- Statlig del 2 mill. kr.
- Klart til utlysning konkurranse når statlige midler er tilgjengelig.





Status pågående prosjekter.

Prosjekter under prosjektering og utførelse

Fv. 890 Føresvikvegen (Bokn kommune)

- Tiltak: *Utbedring av eksisterende veg med ensidig fortau/G/S veg.*
- Reguleringsplan er vedtatt.
- Prosjektet er finansiert av Rogaland fylkeskommune, Bokn kommune og Haugalandspakken.
- Kostnad 25 mill.
- Finansiering: 8 mill.kr i Haugalandspakken.
- Byggeplan pågår.
- Grunnerverv pågår.
- Byggestart vår 2017





Status pågående prosjekter.

Prosjekter under prosjektering og utførelse

E134 Ølen – Ølensvåg (Vindafjord kommune)


- Tiltak: *3200 m. gang- og sykkelveg mellom Ølen og Ølensvåg.*
- Anslag på reguleringsplannivå: 70 mill.2015-kr.
- Byggeplan og grunnerverv pågår.
- Anbudsgrunnlag under utarbeidelse.
- Byggestart vår 2017.



Status pågående prosjekter. Prosjekter under prosjektering og utførelse

E134 Ølen TS-tiltak (*Vindafjord kommune*)

- Tiltak: *Sikre kryssing og fortau langs E134*
- Byggesak i Vindafjord kommunes regi.
- Total kostnad: 6,3 mill. 2015-kr.
- Haugalandspakken 3,5 mill. kr.
- Anlegget er under bygging

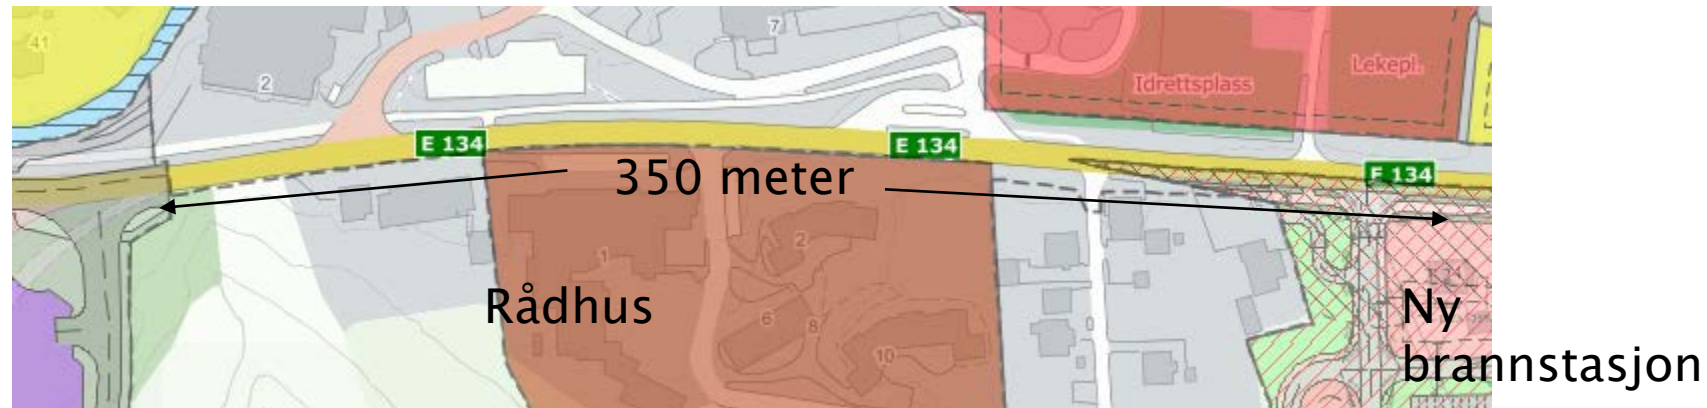


Status pågående prosjekter.

Prosjekter under prosjektering og utførelse

Fv. 511 Bygnes – Søylebotn (*Karmøy kommune*)

Tiltak: *Gang- og sykkelveg og delvis ny veg*

- Arbeidet med byggeplan og grunnverv pågår.
- Prosjekt har en kostnad på 57 mill. 2015-kr.
- Prosjektering ferdig sommer 2016.
- Anbudsgrunnlag under utarbeidelse.
- Mulig byggestart mars. 2017.

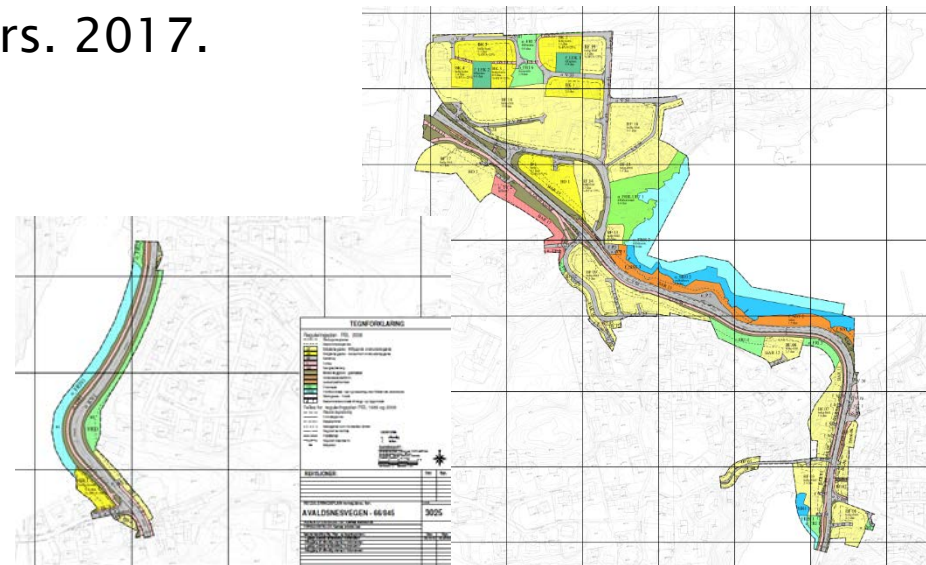



Statens vegvesen

Status pågående prosjekter.

Prosjekter under planlegging


E134 Ølensvåg TS-tiltak (Vindafjord kommune)



- Tiltak: *TS tiltak i Ølensvåg, sikre kryssing av E134 for myke trafikanter, samt bedre kryssløsning mot skule/Vågshagen.*
- Reguleringsplan pågår i Vindafjord kommunes regi.
- Kostnad 26 mill.
- Plan ute på høring.
- Forventa vedtak i kommunen des 2016.
- Samordnes med G/S Ølen -Ølensvåg.
- Mulig byggestart 2018.



Kiwi

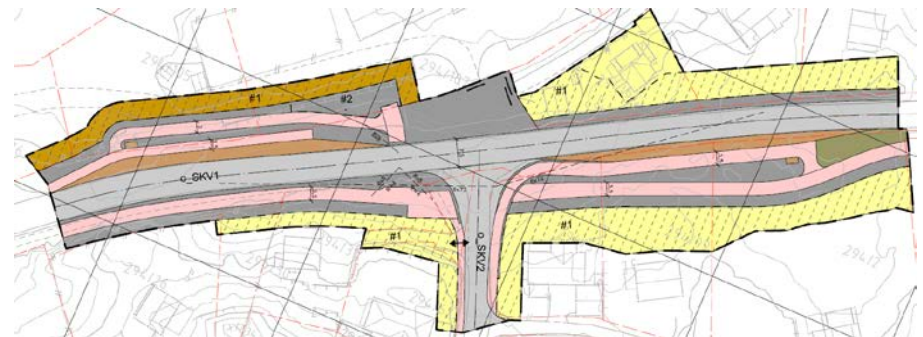

Vågshagen



Status pågående prosjekter.

Prosjekter under planlegging

Fv. 734 Håkull – Trovåg (*Vindafjord kommune*)

- Tiltak: *Gang- og sykkelveg*.
- Reguleringsplan vedtatt i Vindafjord kommune.
- Ca 3 km lang strekning.
- Anslag på reguleringsplannivå er 35 mill. kr
- Mulig byggestart 2017.






Status pågående prosjekter. Prosjekter under planlegging

E134 Espelandssvingane (Vindafjord kommune)

- Tiltak: *G/S langs E134.*



- Reguleringsplan pågår
- Grunnundersøkelser gjort.
- Ser på oppgradering av E134 med evt. vedlikeholdsmidler .
- Midler i Haugalandspakken: 66 mill. 2015-kr.
- Plan ut på høring før påske 2017.
- Mulig byggestart høst 2018.

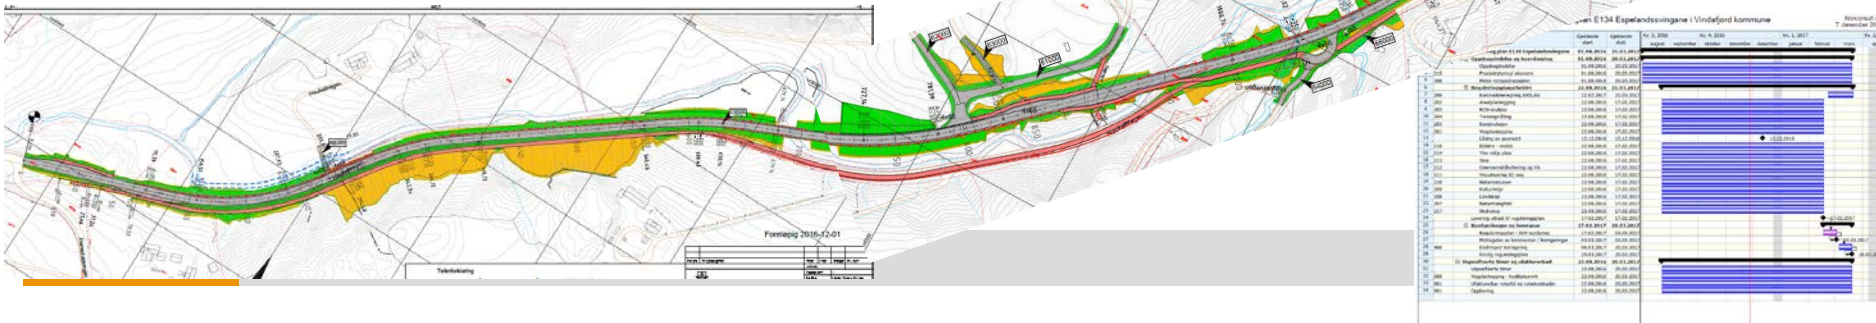

Status pågående prosjekter. Prosjekter under planlegging


Fv.923 Salhusvegen (Karmøy kommune og Haugesund kommune)

Tiltak: Sykkelfelt og fortau på strekning ca. 2,6 km.

Storasund



- Reguleringsarbeidet pågår.
- Det pågår avklaring av grenser til sirkeleiendommer for delen i Haugesund kommune.
- Delfinansiert gjennom Haugalandspakken: 30 mill.kr.
- Reguleringsplanen for Karmøy kommune klar for vedtak des. 2016. (utsatt til jan 2017)
- Mulig byggestart 2017 /18 i Karmøy




Figur 9: Profil med smal buffersone

Status pågående prosjekter.



Prosjekter under planlegging

Fv.47 Fagerheim – Ekrene (*Haugesund og Sveio kommune*)

- Tiltak: *Ny hovedveg Haugesund – Sveio.*

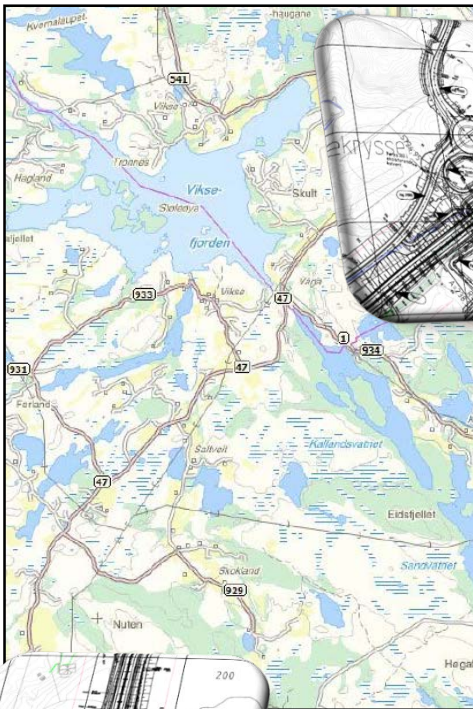

- Ca 6,5 km ny vei, to kommuner og to fylker.
- Reguleringsplan med konsekvensutredning pågår.
- Har varslet oppstart på nytt.
- Oversendes kommunene vår 2017.
- Mulig byggestart vinter 2018.

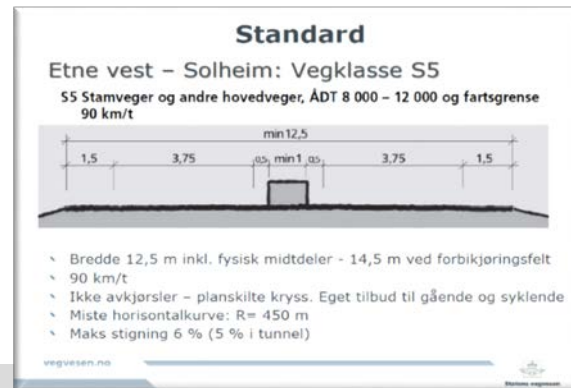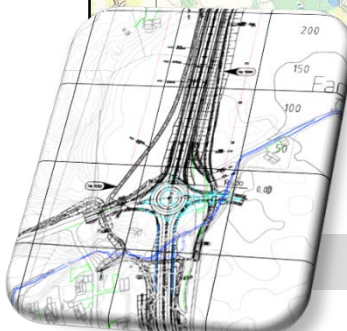


Status pågående prosjekter.

Prosjekter under planlegging

Fv.47 Karmsundgata (Haugesund kommune)

- Tiltak: *Firefelt med G/S veg gjennom Karmsundgata*
- Reguleringsplan for Karmsundgata mellom E134–Storasundgata er vedatt av Haugesund kommune.
- Delstrekning på ca 1300 meter.
- Anslag på reguleringsplannivå: 293 mill. 2015-kr.
- SvV har påklagd endelig vedtaket i bystyret 07.09.16 SvV og HK er i dialog for å finne løsning på klagen.
- Framdrift er avhengig av dialog med HK ang. klagen.





Status pågående prosjekter.

Prosjekter under planlegging

Fv. 938 Skjoldavegen (Haugesund kommune)

- Tiltak: *Gang- og sykkel med fortau* .
- Forprosjekt er startet.
- Trangt å komme fram.
- Mye trafikk i Skjoldaveien, ca 10 000 i ÅDT.
- Finansiering frå Haugalandspakken 25 mill.kr.
- Mulig byggestart 2018.

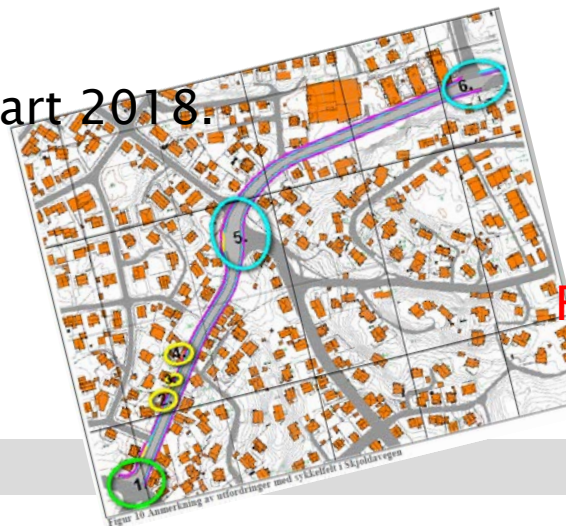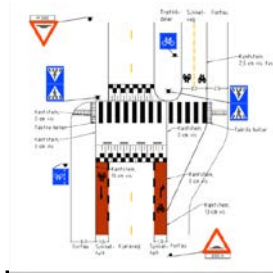


Flotmyr

Status pågående prosjekter. Prosjekter under planlegging

Fv.47 Norheim og E134 Norheim (*Karmøy kommune*)

- Tiltak: *Breddeutvidelsen til firefelt samt G/S løsning for øst-vest og nord-sør.*
- Prosjektet ses i sammenheng med kollektivløsning Salhusvegen – Norheimsterminalen.
- Det er satt av 20 mill. fra Haugalandspakken til prosjektet.
- Kollektivdelen blir finansiert gjennom fylkesvegmidler.
- Reguleringsplan er vedtatt
- Mulig byggestart 2017.

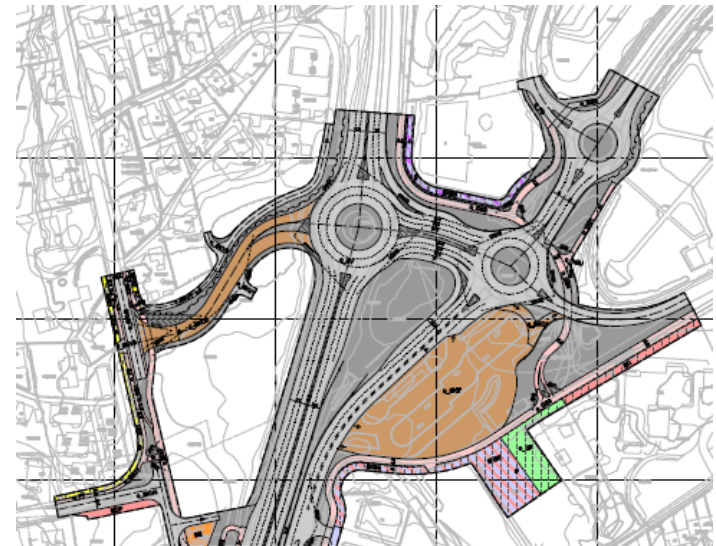

Status pågående prosjekter. Prosjekter under planlegging


Fv. 47 Åkra Sør – Veakrossen (*Karmøy kommune*)

- Tiltak: *Ny hovedvei.(omkjøringsvei)*



Innsigelsen fra Fylkesmannen i Rogaland tas dermed ikke til følge.

- Fylkesmannen hadde innsigelse til planen, januar 2016.
- Innsigelsen ikke tatt til følge 02.12.16
- Arbeid med reguleringsplan under oppstart.
- Kostnadsestimat 5-700 mill.kr.

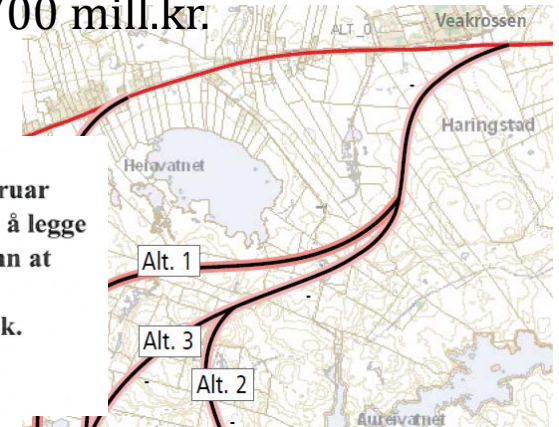



Status pågående prosjekter.

Prosjekter under planlegging

Fv. 47 Veakrossen – E134 (Karmøy kommune)



- Tiltak: Kommunedelplan med KU.
- Planprogram vedtatt i Karmøy kommune
- Ser strekningen på Fv.47 i helhet.
- Asplan Viak er valgt som konsulent.
- Oppstart av konsulent er gjort, synfaring 23.11
- Plan klar for høring mars 2018

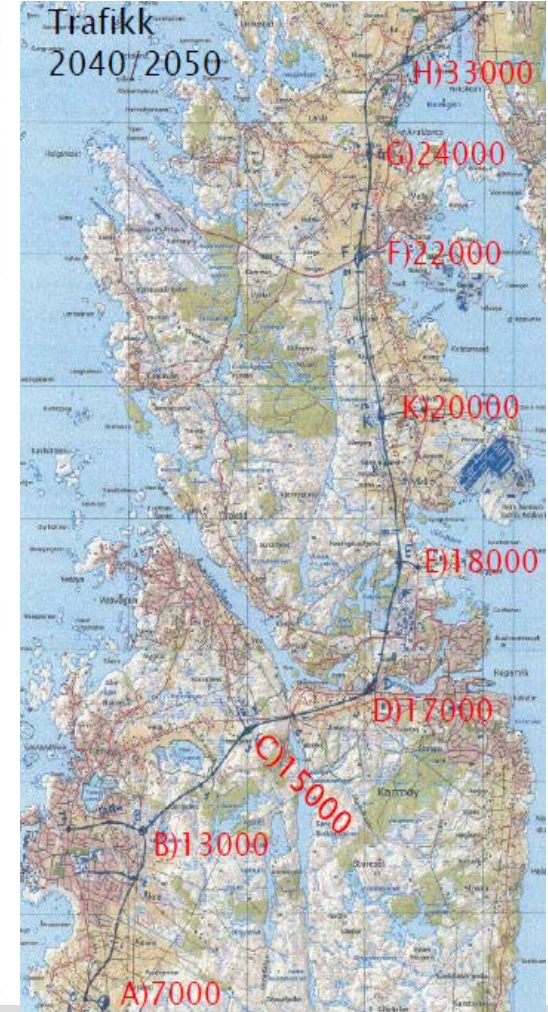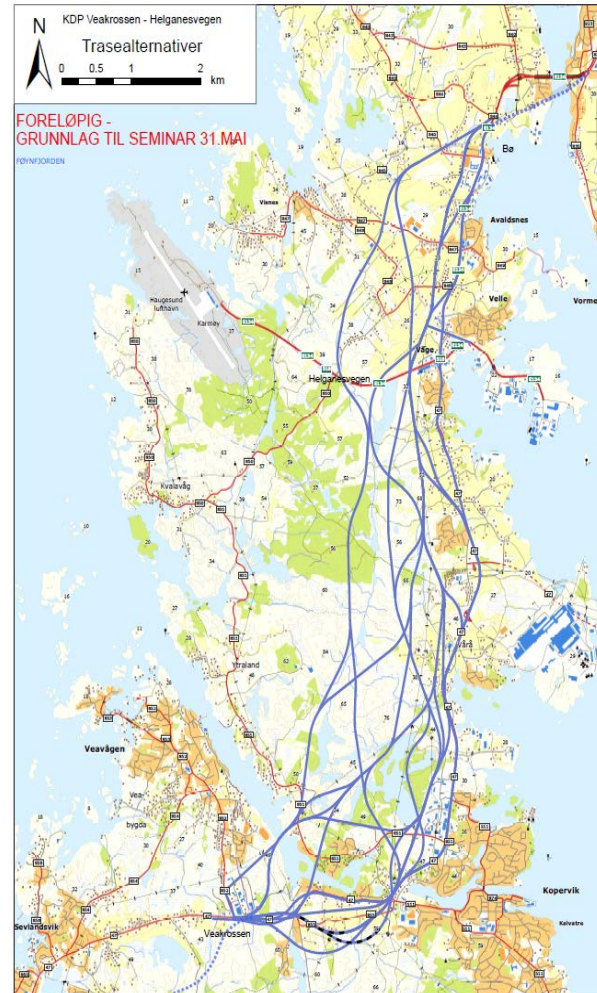

Status pågående prosjekter. Prosjekter under planlegging

Fv. 47 Skudenes – Kyrkjeleite, (*Karmøy kommune*)


- Tiltak: *Gang- og sykkelveg på ca. 2,7 km.*
- Reguleringsplan pågår.
- Det pågår ferdigstillelse av tegninger før planen blir sendt til kommunen for behandling.
- Det vil bli gjennomført et nytt anslag for prosjektet.
- Mulig byggestart i 2019.



Status pågående prosjekter. Prosjekter under planlegging

Fv.511 Åsebøen – Stangeland (*Karmøy kommune*)

- Tiltak: *Tosidig fortau.*
- Anslag på reguleringsplannivå: 31 mill.2015-kr.
- Byggeplanlegging pågår
- Byggestart sommer 2017
- Utfordring vannavrenning opp mot kommunen.
- Avkjørsler som skal løysast i grunnverv
- Trangt, utfordrande byggeplanarbeid

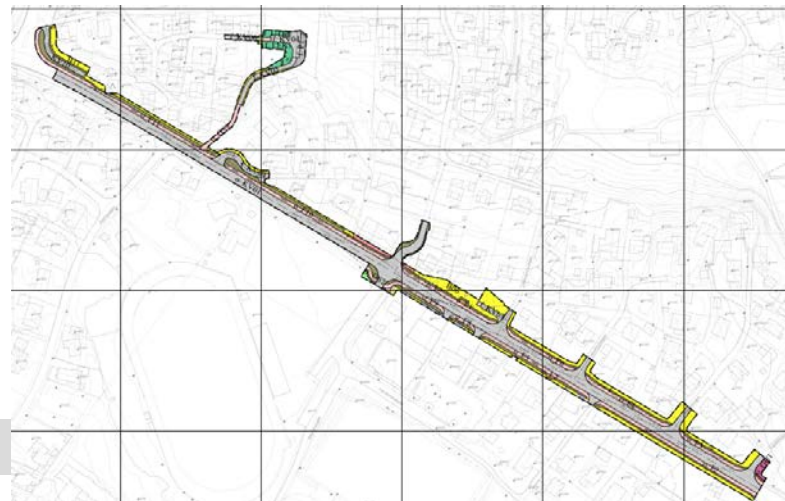



Byggarena 2016 Haugesund

Prosjekter under prosjektering og utførelse

13. Fv. 890 Føresvikvegen (Bokn kommune)

- Tiltak: *Utbedring av eksisterende veg med ensidig fortau/G/S veg.*
- Utbedring av dagens vei lengde ca 2 km med fortau/G/S veg
- Kostnad 25 mill.
- Byggeplan pågår.
- Byggestart 2017




Status pågående prosjekter. Prosjekter under planlegging

Fv.47 Klubben (*Karmøy kommune*)

- Tiltak: *Gang- og sykkelveg med gangfelt*




- Reguleringsplan utsatt i påvente av KDP for strekningen.
- Det er gjennomført folkemøte.
- Det er avsatt 9 mill. kr. til prosjektet

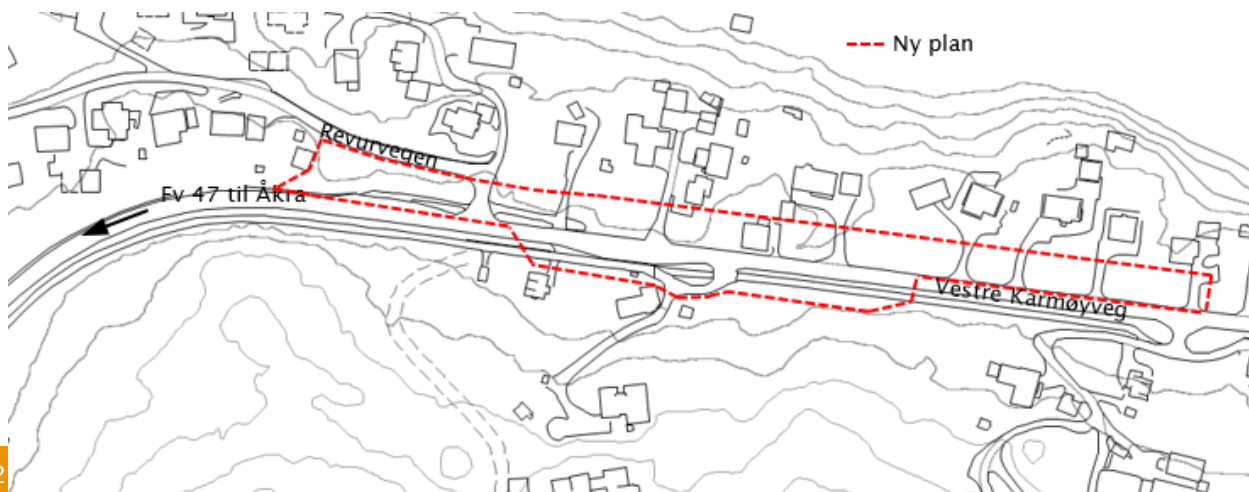

Status pågående prosjekter. Prosjekter under planlegging

Fv.47 Matlandsletta (*Karmøy kommune*)


- Tiltak: *Undergang.*
- Reguleringsplan utsatt i påvente av resultat av KDP for strekningen.
- Det er satt av 14 mill. 2015-kr til prosjektet.

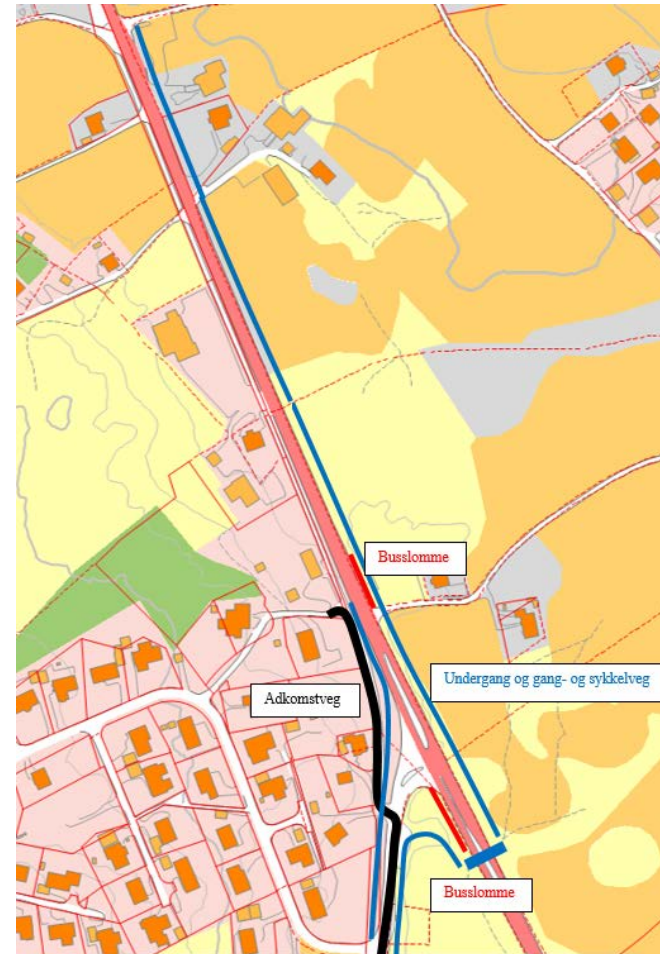

Status pågående prosjekter. Prosjekter under planlegging

E1 34 Frakkagjerdkrysset (Tysvær kommune)

- Tiltak: Ny kryssløsning
- Reguleringsplan skal utarbeides.
- Forprosjekt startet.
- Forventer plan klar for høring juni 2017
- Ser på ulike løsninger.
- Reguleringsplan finansiert av Haugalandspakken.
- Ingen finansiering til bygging.

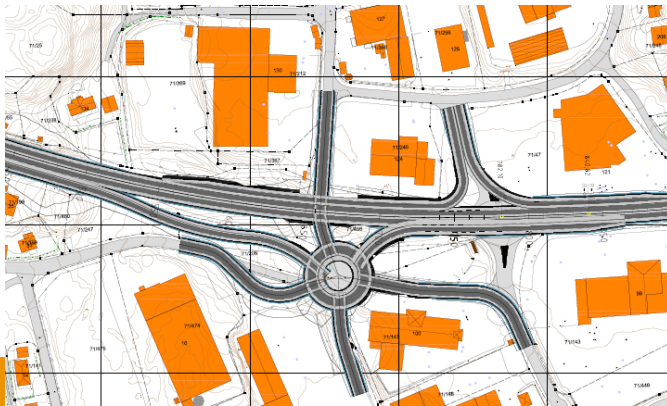



Vegnr	Prosjekt		Tiltak	Kostnad
				(mill. 2015-kr)
Rv/Fv	Sykkelskur på utvalde haldeplasser	Programområde kollektiv	Oppgradering	19
Rv/Fv	Busslommer på utvalde haldeplasser	Programområde kollektiv	Oppgradering	53
Rv/Fv	Planleggingsmidlar			28
Fv47	Skudenes aldersheim – X Fv.511	Programområde G/S	Vedlikehaldsarbeid	1
E39	Hetland sør	Programområde kollektiv	Ny busslomme	2
E39	Hetland nord	Programområde kollektiv	Ny busslomme	2
E39	Haukås	Programområde kollektiv	Snuplass	2
Fv47	Engvegen	Programområde	Forlenging av eksisterande veg	11
Fv.511	Bygnes – Søylebøtn	Store prosjekt (Under bygging)	Gang- og sykkelveg og delvis ny veg	60
Fv.890	Føresvik	Programområde G/S	Gang- og sykkelveg /fortau	9
Fv511	Åsebøen – Stangeland	Programområde G/S	Ny gang- og sykkelveg	37
Fv734	Håkull – Trovåg	Programområde G/S	Ny gang- og sykkelveg	40
Fv47	Klubben	Programområde TS	Nytt lyskruss for fotgjengar	11
E134	Ølensvåg – Ersland	Programområde G/S	Lys på gang- og sykkelveg	2
E134	Etne sentrum	Programområde TS	Fortau langs E134	4
Fv.923	Salhusvegen	Programområde G/S	Sykkelfelt med fortau	110
E134	Utvik	Programområde kollektiv	Undergang	1
Fv.938	Flotmyr – Stemmen (Skjoldavegen)	Programområde G/S	Sykkelveg med fortau	29
E134	Ølen*	Programområde	Sikrere kryssing, fortau langs E134	21
E134	Ølen – Ølensvåg	Store prosjekter	Ny gang- og sykkelveg	79
Fv.873	Norheim	Programområde mindre utbedringer	Breiddeutviding til 4-felt	28
E134	Norheim – Haugesund grense	Programområde G/S	Gang og sykkel	7
Fv47	Karmsundgata (E134–Storasundgata)	Store prosjekter	Breiddeutviding til 4-felt	322
E134	Ølensvåg	Store prosjekter	Undergang, busshaldeplasser	29
E134	Mørkelikrysset	Programområde TS	Ombygging av kryss	23
Fv.939	Tahaugata (kryss m Haraldsgata)	Programområde miljø og støy	Tilskot til kryssutbetring MPG	1
Fv47	Fagerheim – Ekrene	Store prosjekt	Tofeltsveg med forbikøyring	715
Fv47	Skudenes – Kyrkeleite	Programområde G/S	Ny gang- og sykkelveg	42
Fv47	Eide – T-forbindelsen	Store prosjekt	Ny hovedvei	550
Fv47	Åkra sør – Veakrossen	Store prosjekt	Ny hovedvei,omkjøringsveg	660
E134	Espelandssvingane	Store prosjekt	Ny gang og sykkelveg	75
E39	Haukås – Apeland	Programområde G/S	Ny gang- og sykkelveg	22
E39	Hetland – Haukås	Programområde G/S	Ny gang- og sykkelveg	22
E134	Husøyvegen	Programområde G/S	Ny gang- og sykkelveg	20
Fv47	Veakrossen – Eide	Store prosjekt	Ny hovedvei	440
Fv.924	Skaisvollvegen – Austrheimvegen	Programområde TS	Mindre tiltak på strekning	20
Fv.47	Matlandsletta	Programområde TS	Undergang, fotgjengarkryss	15
Fv771	Førrestjørn – Leite – Frakkagjerd	Programområde G/S	Ny gang- og sykkelveg	18
Fv.511	Blikshavn – Sørstokke	Programområde mindre utbedringer	Mindre tiltak på strekning	7
	Betaling av lån			231
	Totalt			3 768



statens vegvesen
