

Tilskot til punktutbetring og trygg skuleveg

RAPPORTERINGSSKJEMA 2017

Sluttrapporten skal sendast til: hfk@hfk.no Rapporteringsskjema merkast med: "Tilskot til punktutbetring og trygg skuleveg – rapportering – ref. 2014/13889"

(Alle punkta **skal** fyllast ut).

Namn på tiltaket

7407 – Utbetring av FV 233 Ebbesvikvegen

Fylkesvegnummer

Søkjar (kommune)

Namn:	Fjell Kommune		
Adresse:	Postboks 184		
Postnr./stad:	5342 Straume		
Org.nr.:	951 996 777		
Kontonr.:	5261.05.00013	Prosjektnr.: 7407 Ebbesvikvegen	Ressursnr.:

Administrativ kontaktperson hjå søkjar

Navn:	Therese Skårnes Borgen	Telefon: 55 09 71 01
E-post:	Therse.borgen@fjell.kommune.no	Mobil: 958 14 775

Tidsråde for tiltaket

Oppstart:	17.03-2017
Ferdigstilt:	03.08-2018

Totalkostnad

Tildelt tilskotssum:	2 000 000,-
Eigenandel (eks mva):	2 200 000,-
Totalkostnad (eks mva):	4 200 000,-

Skildring av tiltaket som er gjennomført


Me søkte Fylkeskommunen om «Tilskot til punktutbetring og trygg skuleveg» nå i 2017 der me fekk 2 mill. i tilskot Totalt har me då 4.2 mill. til prosjektet minus kostnader som er gått prosjektering.

Prosjektert løysning har ein kalkyle på 13 mill. inkl. VA, og me sitt då å grublar på korleis me kan få gjennomført prosjektet innanfor dei midlar som er mulig å oppnå. Samferdsle har hatt dialog, og me fekk eit møte med Statens Vegvesen den 28.09.2017 for avklaring på kva løysning som er realistisk å kunne klare å få gjennomført innan 2018.

Konklusjon frå møte var at dersom vegen skal utbetrast, skal fortau etablerast på høgre sider med ei normalprofil som vist med utklipp. Fortau skal då vidareførast frå krysset i snekkevika opp høgre side til toppen av bakken.

Prosjektert normalprofil.

Nåverande situasjon sett ovanfrå.

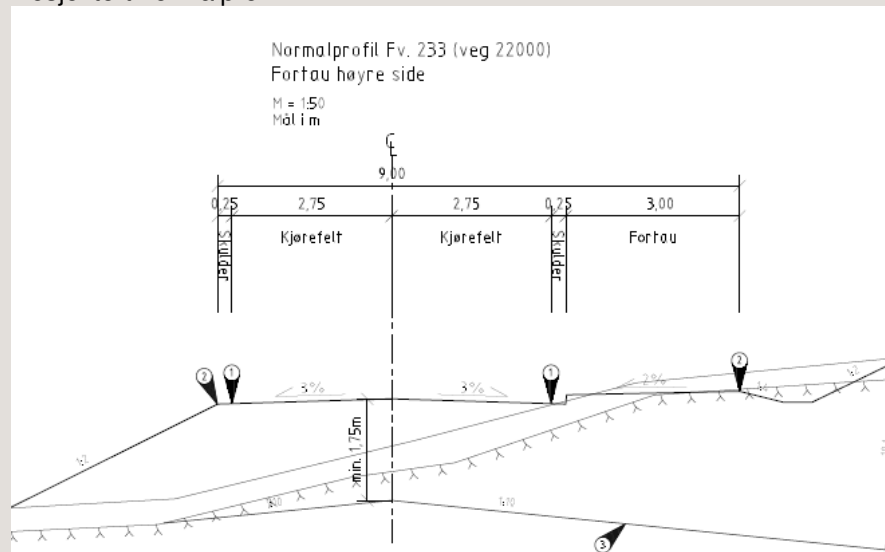

Tiltaket var retta mot ein tryggare skuleveg for dei myke trafikantane, og med utvida vegareal ville strekninga bli meir trafikksikker med tanke på møteulykker samt betre tilkomst for større kjøretøy, då spesielt vinterstid. Vegen er prosjektert slik at buss kan møte bil og Lastebil kan møte Lastebil.

Samferdsle beklagar sein tilbakemelding, men me håpa me kunne komme med ein avklaring før fristen gjekk ut.

Me har framleis dialog med Svv, men dersom det ikkje kjem meir midlar inn til dette prosjektet så må prosjektet leggast ned. Me håpar i det lengste at det framleis er mulig å utbetre denne strekninga.

Mvh
Terje Dolvik

