



**Buskerud**  
Fylkeskommune



**Hordaland**  
fylkeskommune



**Telemark**  
fylkeskommune


---

Regional plan for Hardangervidda

# Statusrapport 2014

## Handlingsprogram 2015-2018

---

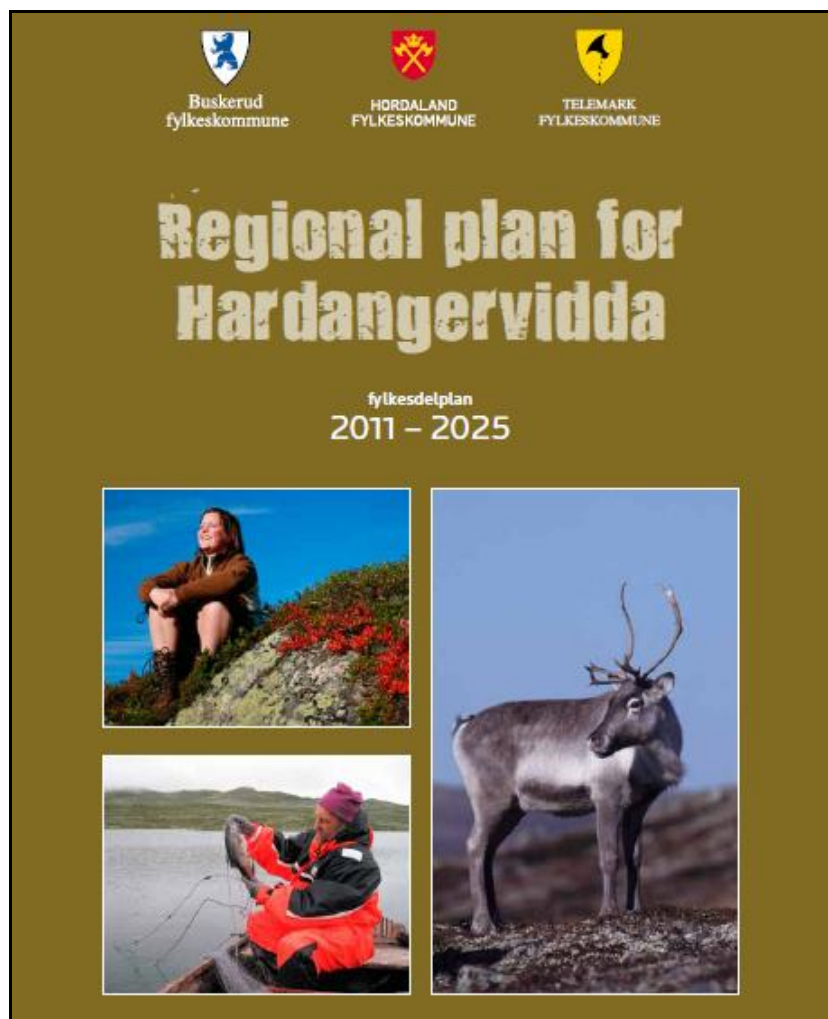

Behandlet i Hardangerviddarådet 27. mai 2014

## Innhold

|                                                                      |         |
|----------------------------------------------------------------------|---------|
| Innhold                                                              | side 2  |
| 1. Innledning                                                        | side 3  |
| 2. Gjennomgang av status og videreføring av ulike tiltak (2013-2018) | side 4  |
| 3. Handlingsprogram 2015-2018                                        | side 9  |
| <b>Vedlegg:</b>                                                      |         |
| Økonomistatus per 21.05.2014                                         | side 10 |

## 1. Innledning

Regional plan for Hardangervidda er utarbeidet med utgangspunkt i bestillingsbrev fra Miljøverndepartementet 12. april 2007. Planen ble sluttbehandlet med like vedtak i de tre fylkestingene høsten 2011.

Den regionale planen ble etter dette, i henhold til Plan- og bygningslovens §8-4, oversendt Miljøverndepartementet. Departementet meddelte i brev datert 16.07.2012 at de hadde tatt planen til orientering.

Planens kapittel 9 har en handlingsplan med en rekke underpunkter. Innledningsvis her poengteres følgende:

For at Regional plan for Hardangervidda skal få den virkning den er ment å få, forutsettes det at alle aktører viderefører intensjonene og føringene i mer utdypende og bindende planlegging, i løpende forvaltning og ved at det gjennomføres nye kunnskapssøkende prosjekter.

Planarbeidet har vist behov for videre oppfølging gjennom forvaltningsrettede og planrettede tiltak, dels i fellesskap og dels av ulike aktører.

Planarbeidet har også vist behov for å følge opp en rekke problemstillinger gjennom utdypende faglige prosjekter. Dette vil dels styrke kunnskapsgrunnlaget for gode beslutninger ved rullering og det vil dels være nødvendig for videre kommunal planleggingen. Oppfølgende prosjekter er både villreinfaglige og samfunnsfaglige rettet mot næringsutvikling.

Med bakgrunn i dette, ble det utarbeidet et handlingsprogram for perioden 2013-2016. Dette ble vedtatt i fylkestingene våren 2013 (7. februar i Buskerud, 13. mars i Hordaland og 16. april i Telemark).

Foreliggende dokument gir en rapport mht. hva som har skjedd siden handlingsprogrammet ble vedtatt våren 2013 og fram til mai 2014, samt en rullering av handlingsprogrammet for perioden 2015-2018.

Siden tiltakene/prosjektene er i prosess, er rapportering, status per i dag og videre framdrift samlet i en omtale av hvert enkelt tiltak/prosjekt.

## 2. Status og videreføring av ulike tiltak og prosjekter (2013-2018)

Nummereringen referer seg til prosjektpunktene i Handlingsprogram 2013-2016. Hvert tiltak/prosjekt oppsummeres nedenfor mht. hva har skjedd, hva er status og planlagt videre framdrift.

### Tiltak 1. Hardangerviddarådet

Alle aktører oppnevnte sine medlemmer til Hardangerviddarådet i løpet av sommerhalvåret 2013. Rådet hadde konstituerende møte på Villreinsenteret på Skinnarbu i Telemark 11. oktober 2013.

**Rådet** har etter dette følgende medlemmer:

| Medlem                   | Varamedlem                |                         |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Tony Kjøl                |                           | Hol kommune             |
| Dag Lislien              | Per Torstein Hellumbråten | Rollag kommune          |
| Eli Hovd Prestegården    |                           | Nore og Uvdal kommune   |
| Steinar Bergsland        | Birger Hovden             | Tinn kommune            |
| Arne Vinje               |                           | Vinje kommune           |
| Eivind Tokheim           |                           | Odda kommune            |
| Steinar Langesæter       |                           | Ullensvang herad        |
| Anved Johan Tveit        |                           | Eidfjord kommune        |
| Hans Petter Thorbjørnsen |                           | Ulvik herad             |
| Øyvind Holm              |                           | Fylkesmann i Buskerud   |
| Hans Bakke               |                           | Fylkesmann i Telemark   |
| Kjell Kvingedal          |                           | Fylkesmann i Hordaland  |
| Anne Sandum              | Steinar Berthelsen        | Buskerud fylkeskommune  |
| Terje Vegard Kopperud    | Tom Erik Hauger           | Buskerud fylkeskommune  |
| Lars Bjaadal             |                           | Telemark fylkeskommune  |
| Karin S. Matisen         |                           | Telemark fylkeskommune  |
| Magnar Lussand           |                           | Hordaland fylkeskommune |
| Rasmus Laupsa Rasmussen  |                           | Hordaland fylkeskommune |
| Olav H. Opedal           |                           | Villreinnemnda          |

Ved konstitueringen ble følgende valgt:

**Leder:** Lars Bjaadal, Telemark fylkeskommune

**Nestleder:** Anved Johan Tveit, Eidfjord kommune

**Arbeidsutvalg (AU):** Lars Bjaadal, Anved Johan Tveit og Eli Hoved Prestegården, Nore og Uvdal kommune



Hardangerviddarådet 13. oktober 2013  
Foto: Dorthe Huitfeldt

Det er også etablert et mer uformelt **administrativt kontaktutvalg** med følgende personer:

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Kjell Mykkeltvedt | Hol kommune             |
| Ellen Skarsten    | Rollag kommune          |
| Grete Blørstad    | Nore og Uvdal kommune   |
| Svein Erik Lund   | Nore og Uvdal kommune   |
| Oddmund Olesrud   | Tinn kommune            |
| Bjørn Bjørnsen    | Tinn kommune            |
| Dorthe Huitfeldt  | Vinje kommune           |
| Lasse Mathisen    | Vinje kommune           |
| Rolf Bøen         | Odda kommune            |
| Kent Håkull       | Ullensvang herad        |
| Gunnar Elnan      | Eidfjord kommune        |
| Lars B. Præstin   | Ulvik herad             |
| Even Knutsen      | Fylkesmann i Buskerud   |
| Sigurd Lenes      | Fylkesmann i Telemark   |
| Øistein Aasland   | Fylkesmann i Hordaland  |
| Tord Bakke        | Fylkesmann i Hordaland  |
| Silje Ljøterud    | Villreinnemda           |
| Ole Bjørn Bårnes  | Telemark fylkeskommune  |
| Eva-Katrine Taule | Hordaland fylkeskommune |
| Sigurd Fjose      | Buskerud fylkeskommune  |
| Tore Gilhuus      | Buskerud fylkeskommune  |

### **Sekretariat**

Buskerud fylkeskommune har for tiden sekretariatet, med Ellen Korvald som ansvarlig.

I rådsmøtet 13. oktober ga Rådet uttrykk for at det ønsker et fast sekretariat, framfor en ambulerende løsning slik handlingsprogrammet skisserer. Rådets leder henvendte seg på bakgrunn av dette til Buskerud fylkeskommune (Bfk) med spørsmål om en mer varig løsning knyttet til Bfk.

Sekretariatsbehovet er anslått til maksimalt 15% stilling og en kostnadsramme på 120.000 kroner.

Bfk har med bakgrunn i dette tilbudt Hordaland og Telemark at Bfk påtar seg dette under forutsetning av økonomisk bidrag på 40.000 kroner fra hver av fylkeskommunene.

Hordaland og Telemark fylkeskommuner har uformelt bekreftet at de ønsker denne løsningen.

### **Arbeidsutvalget**

AU hadde møte på Geilo 9. januar i etterkant av ordførerutvalgets møte. Hovedtema da var forholdet til ordførerutvalget, generell statusrapport for prosjekter og rammer for neste Rådsmøte.

### **Økonomi**

Ved avslutning av Regional plan for Hardangervidda gjensto 704.000 kroner. Dette ble i handlingsprogram 2013-2016 øremerket flere av prosjektene i handlingsprogrammet, samt et beløp (134.000 kroner) til Hardangerviddarådets disposisjon (til møter mm.)

Økonomirapport ligger vedlagt.

### **Diverse prosjektarbeid**

Flere konkrete fellesprosjekter er skissert i handlingsprogrammet. Det er etablert prosjektgrupper med en hovedansvarlig for alle prosjektene. Det er lagt vekt på bred sammensetning av prosjektgruppene og fordeling av ansvar mellom aktørene.

Det har tatt noe tid å få finansiering av alle prosjektene på plass. Men alle tiltak er nå, mai 2014, fullfinansiert. Når dette nå er sikret, er nærmere prosjekt Konkretisering og forespørsler til konsulenter igangsatt.

Siden dette tok noe mer tid enn opprinnelig forutsatt, er oppstart og slutføring forskjøvet noe i tid i forhold til Handlingsprogram 2013-2016.

Status for hvert av disse (prosjekt 4-9) omtales nedenfor. Se ellers Handlingsprogram 2013-2016 for mer utfyllende informasjon om det enkelte prosjekt.

## Tiltak 2. Rullere Regional plan for Hardangervidda.

Foreløpig ikke aktuelt.

Som skissert i Handlingsprogram 2013-2016 bør spørsmålet vurderes i neste regionale planstrategi i de tre fylkene (2015/2016) med sikte på rullering 2016-2017.

## Tiltak 3. Kommunal planoppfølging.

Skjer i regi av den enkelte kommune.

## Prosjekt 4. Utmarksnæringer i Lnf-områder

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prosjektgruppe:</b>           | <i>Oddmund Olesrud, Tinn kommune (prosjektansvarlig)</i><br>Grete Blørstad, Nore og Uvdal kommune<br>Dorthe Huitfeldt, Vinje kommune<br>Tore Gilhuus, Buskerud fylkeskommune<br>Hans Bakke, Fylkesmann i Telemark<br><br>Private og andre interesser planlegges involvert gjennom en referansegruppe. |
| <b>Kostnader og finansiering</b> | Anslått total kostnad: 300.000 kroner. Herav <ul style="list-style-type: none"><li>• 120.000 bevilget fra planprosjektmidler</li><li>• 180.000 bevilget fra kommunene og fylkeskommunene.</li></ul>                                                                                                   |
| <b>Tidsplan</b>                  | Prosjektgruppa har utarbeidet konkurransegrunnlag. Prosjektansvarlig har sendt forespørsel til aktuelle konsulenter med svarfrist 23. mai 2014.<br><br>Prosjektet forutsettes levert innen 31.03.2015                                                                                                 |

## Prosjekt 5. Villreinens arealbruk

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prosjektgruppe:</b>           | <i>Svein Erik Lund, Nore og Uvdal kommune (prosjektansvarlig)</i><br>Bjørn Bjørnsen, Tinn kommune<br>Gunnar Elnan, Eidfjord kommune<br>Even Knutsen, Fylkesmann i Buskerud<br>Ellen Korvald, Buskerud fylkeskommune<br><br>Private og andre interesser skal involveres. Hvordan avklares i prosjektplanen. |
| <b>Kostnader og finansiering</b> | Anslått total kostnad: 200.000 kroner. Herav <ul style="list-style-type: none"><li>• 100.000 bevilget fra planprosjektmidler</li><li>• 100.000 bevilget fra Miljødirektoratet.</li></ul>                                                                                                                   |
| <b>Tidsplan</b>                  | Prosjektgruppa er i slutfasen med prosjektbeskrivelse. Prosjektansvarlig er i dialog med Norsk Villreinsenter om deres medvirkning i oppdraget.<br><br>Sluttidspunkt for prosjektet anslås til utgangen av 2014.                                                                                           |

## Prosjekt 6. Lufsjåtangen

|                        |                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Prosjektgruppe:</b> | <i>Ole Bjørn Bårnes, Telemark fylkeskommune (prosjektansvarlig)</i> |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | <p>Svein Erik Lund, Nore og Uvdal kommune<br/>Ellen Skarsten, Rollag kommune<br/>Bjørn Bjørnsen, Tinn kommune<br/>Even Knutsen, Fylkesmann i Buskerud<br/>1 repr. fra Fylkesmannen i Telemark<br/>Ellen Korvald, Buskerud fylkeskommune</p> <p>Norsk Villreinsenter Sør bør få en sentral rolle i prosjektet.</p> |
| <b>Kostnader og finansiering</b> | <p>Anslått total kostnad: 300.000 kroner. Herav</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100.000 bevilget fra planprosjektmidler</li> <li>• 100.000 fra Fylkesmann i Buskerud/Miljødirektoratet</li> <li>• 100.000 fra Fylkesmann i Telemark/Miljødirektoratet</li> </ul>                                     |
| <b>Tidsplan</b>                  | <p>Arbeid med prosjektbeskrivelse er startet opp.</p> <p>Sluttidspunkt for prosjektet anslås til sommer 2015.</p>                                                                                                                                                                                                 |

### Prosjekt 7. Kartlegging av fritidsbruk og opplevelser

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prosjektgruppe:</b>           | <p><i>Eva Katrine Taule, Hordaland fylkeskommune (prosjektansvarlig)</i><br/>Eirik Knive, Hordaland fylkeskommune<br/>Line Ramsvik, Hol kommune<br/>Torild Nicolaisen, Vinje kommune<br/>Lars Præstin, Ulvik kommune<br/>Øystein Aasland, Fylkesmann i Hordaland<br/>Eva Lill Kvisle, Buskerud fylkeskommune</p> |
| <b>Kostnader og finansiering</b> | <p>Anslått total kostnad: 300.000 kroner. Herav</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100.000 bevilget fra planprosjektmidler</li> <li>• 100.000 bevilget fra Miljødirektoratet</li> <li>• 100.000 bevilget fra kommunene og fylkeskommunene</li> </ul>                                                   |
| <b>Tidsplan</b>                  | <p>Prosjektgruppe har startet arbeidet med prosjektbeskrivelse.</p> <p>Sluttidspunkt for prosjektet anslås til sommer 2015.</p>                                                                                                                                                                                  |

### Prosjekt 8. Friluftsliv og villrein

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prosjektgruppe:</b>           | <p><i>Kjell Mykkeltvedt, Hol (prosjektansvarlig)</i><br/>Svein Erik Lund, Nore og Uvdal<br/>Lasse Mathisen, Vinje kommune<br/>Rolf Bøen, Odda kommune<br/>Lars Præstin, Ulvik kommune<br/>Øystein Aasland, Fylkesmann i Hordaland<br/>Eirik Knive, Hordaland fylkeskommune<br/>Ole Bjørn Bårnes, Telemark fylkeskommune<br/>Ellen Korvald, Buskerud fylkeskommune</p> |
| <b>Kostnader og finansiering</b> | <p>Anslått total kostnad: 450.000 kroner. Herav</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 150.000 bevilget fra planprosjektmidler</li> <li>• 150.000 bevilget fra kommunene og fylkeskommunene</li> <li>• 150.000 bevilget etter søknad til Miljøverndepartementet. Dette styrker det opprinnelig kostnadsanslag i Handlingsprogram 2013-2016.</li> </ul>          |
| <b>Tidsplan</b>                  | <p>Prosjektet skal bygge på prosjektene villreinsens arealbruk (5) og kartlegging av fritidsbruk (7), og kan først startes opp når disse er nær avslutning.</p> <p>Sluttidspunkt for prosjektet anslås til sommer 2016.</p>                                                                                                                                           |

### **Prosjekt 9. Villrein som reiselivsattraksjon**

Prosjekt er gjennomført i samarbeid med Miljøverndepartementet og andre fjellregioner.

Det har foreløpig ikke lyktes å få til noe bedriftsnettverk rundt Hardangervidda. Men problemstillingen er fortsatt aktuell.

Det er øremerket midler som kan dekke eventuelle kostnader til dette.

### **Prosjekt 10. Miljøsertifisering av reiselivet**

Miljøsertifisering av reiselivsbedrifter pågår med noe ulikt fokus i de forskjellige fylker og kommuner.

Innenfor Hardangerviddakommunene er nå 14 reiselivsbedrifter miljøfyrtårnsertifisert og 2 sertifisert av Norsk Økoturisme (en bedrift har begge sertifiseringer). De 15 bedriftene fordeler seg med 11 i Buskerud, og 2 i hvert av de to andre fylkene.

I Buskerud er det relativt stort fokus på dette som oppfølging av reiselivsplanen. Tilsvarende arbeid er ikke kommet i gang i Telemark og Hordaland.

Hordaland ønsker å prioritere systematisk innsats for dette høyere, og har øremerket midler til dette. Telemark ønsker å se det litt an.



## 4. Handlingsprogram 2015-2018

### Hardangerviddarådet

Det legges opp til ett årlig rådsmøte i mai/juni der statusrapport (årsrapport) og handlingsprogram drøftes før videre behandling i de tre fylkene. Hver enkelt fylkeskommune må selv avgjøre hvordan handlingsprogrammet i løpet av året behandles og sikres fylkespolitisk forankring.

Rådsmøtet legges i tillegg opp med mulighet for drøfting av aktuelle problemstillinger og noen relevante faglige foredrag.

AU møtes etter behov etter ønske fra medlemmer eller sekretariat.

Den administrative kontaktgruppen møtes etter behov.

Reiser og opphold dekkes av aktørene selv. Eventuelle felleskostnader i møtene dekkes av fellesmidler.

Kostnader til sekretariatet dekkes ved en tredeling av kostnadene mellom fylkeskommunene. Dette er anslått til maksimalt 15% stilling med samlet kostnad på 120.00 kroner. Inntil annet er bestemt, legges dette til Buskerud fylkeskommune.

### Prosjekter

Prosjektene gjennomføres som skissert i kap. 2. Det foreslås ingen nye prosjekter i dette handlingsprogrammet. Det vurderes nå som viktigst å få gjennomført pågående arbeider.

Alle prosjekter er fullfinansiert.

Når pågående prosjekter nærmer seg slutten i 2015, vil behov for videreføring og/eller andre prosjekter bli vurdert.

Framdriften for planlagte prosjekter kan oppsummeres slik:

|                                  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Merknader                                                   |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------|
| Rullere Regional plan            |      |      |      |      |      | Finansiering avklares når dette blir aktuelt                |
| Utmarksnæringer i LNF-områder    |      |      |      |      |      | Fullfinansiert med 300.000                                  |
| Villreins arealbruk              |      |      |      |      |      | Fullfinansiert med 200.000                                  |
| Lufsjåtangen                     |      |      |      |      |      | Fullfinansiert med 300.000                                  |
| Kartlegging av fritidsbruk       |      |      |      |      |      | Fullfinansiert med 300.000                                  |
| Friluftsliv og villrein          |      |      |      |      |      | Fullfinansiert med 450.000                                  |
| Villrein som reiselivsattraksjon |      |      |      |      |      | Gjennomføres i samarbeid med andre. Finansiert av MD.       |
| Miljøsertifisering av reiselivet |      |      |      |      |      | Finansiering i Bfk og Hfk er avklart. Tfk må avklare dette. |

## Vedlegg

### Oppfølging av Regional plan for Hardangervidda – økonomistatus 21.05.2014

#### Inntekter:

| Inntekt fra                                                      | Mottatt          | Utestående                           | Annen organisering                        | Sum              |
|------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|
| Restbeløp fra regional plan                                      | 704.000          |                                      |                                           | 704.000          |
| Kommunene                                                        | 272.000          | 34.000 (tilsagn gitt fra Ullensvang) |                                           | 306.000          |
| Staten v/fylkesmenn, Miljøverndepartementet og Miljødirektoratet | 550.000          |                                      |                                           | 550.000          |
| Fylkeskommune                                                    | 84.000           | 42.000 (muntlig bekreftet fra Tfk)   | 100.000 (miljøsertifisering i Tfk og Hfk) | 226.000          |
| <b>Sum</b>                                                       | <b>1.610.000</b> | <b>76.000</b>                        | <b>100.000</b>                            | <b>1.786.000</b> |

#### Disponeres:

|                            | Budsjettert         | Brukt per 22.05.14 | Til disposisjon | Merknad                       |
|----------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------|
| 1. Hardangerviddarådet     | 134.000             | 30.217             | 103.707         |                               |
| 2. Rullere regional plan   | 0                   |                    |                 |                               |
| 3. Kommunal planoppfølging | 0                   |                    |                 |                               |
| 4. Utmarksnæringer         | 300.000             | 0                  | 300.000         |                               |
| 5. Villreinens arealbruk   | 200.000             | 0                  | 200.000         |                               |
| 6. Lufsjåtangen            | 300.000             | 0                  | 300.000         |                               |
| 7. Kartlegging fritidsbruk | 300.000             | 0                  | 300.000         |                               |
| 8. Friluftsliv og villrein | 450.000             | 0                  | 450.000         |                               |
| 9. Villrein og reiseliv    | 0                   |                    |                 |                               |
| 10. Miljøsertifisering     | 100.000             | 0                  |                 | Organiseres i hhv. Tfk og Hfk |
| <b>SUM</b>                 | <b>1.784.000 **</b> | <b>30.217</b>      |                 |                               |

\*\* forutsetter at 34.000 + 42.000 overføres

Merknad:

Kostnader til sekretariat er holdt utenfor.
