

Samhandling innan vegområdet

Presentasjon av dei viktigaste konklusjonane i prosjektet – november 2015



Innhold

- Bakgrunn
- Føremål
- Organisering
- Framdriftsplan
- Resultat
- Sluttleveranse

Bakgrunn for initiativet

- Forvaltningsreformen vart gjort gjeldande frå 1.januar 2010. I løpet av desse åra har både HFK og SVV gjort seg erfaringar med samarbeidet om fylkesvegane i Hordaland.
- Ønskje om å forbetre og presisere følgjande område innan fylkesvegområdet:
 - Planlegging
 - Rapportering og styring i ulike prosjekttypar
 - Vurdering av sentrale styringsdokument
- I tillegg vil HFK gjere ei intern vurdering av rolla som vegeigar
- Svare ut forvaltningsrevisjonen «Samhandling på vegområdet»


Sak i FT desember 2012: «Forvaltningsrevisjon innan samhandling på vegområdet – revisjonsrapport»

VEDTAK:

På bakgrunn av forvaltningsrevisjonsrapport "Samhandling på vegområdet i Hordaland fylkeskommune" ber fylkestinget fylkesrådmannen syta for å:

1. Etablere formaliserte prosjektspesifikke møte for oppfølging av investeringsprosjekt (ref. eigarstyringsmøte i Sogn og Fjordane).
2. Vurderer om det vil vere føremålstenleg å nytte eit nettbasert system for dokumentdeling mellom fylkeskommunen og vegvesenet knytt til vegprosjekt.
3. Etablere meir formaliserte rutinar for den årlege evalueringa av rammeavtalen og vurdere om dette til dømes kan gjerast i samarbeid med dei andre fylkeskommunane i Region Vest.
4. Trekke vegvesenet og andre fylkeskommunar inn i arbeidet med å utarbeide praktiske rutinar for å handtera nye krav til budsjettering og rekneskapsføring i investeringsrekneskapen, og handtering av fleirårige prosjekt."
5. Laga ein handlingsplan innan 15.2.2013 som viser kva tiltak som skal setjast i verk for å følgja opp tilrådingane i rapporten, når tiltaka skal setjast i verk og kven som skal ha ansvaret for iverksettinga.

Prosjektplan

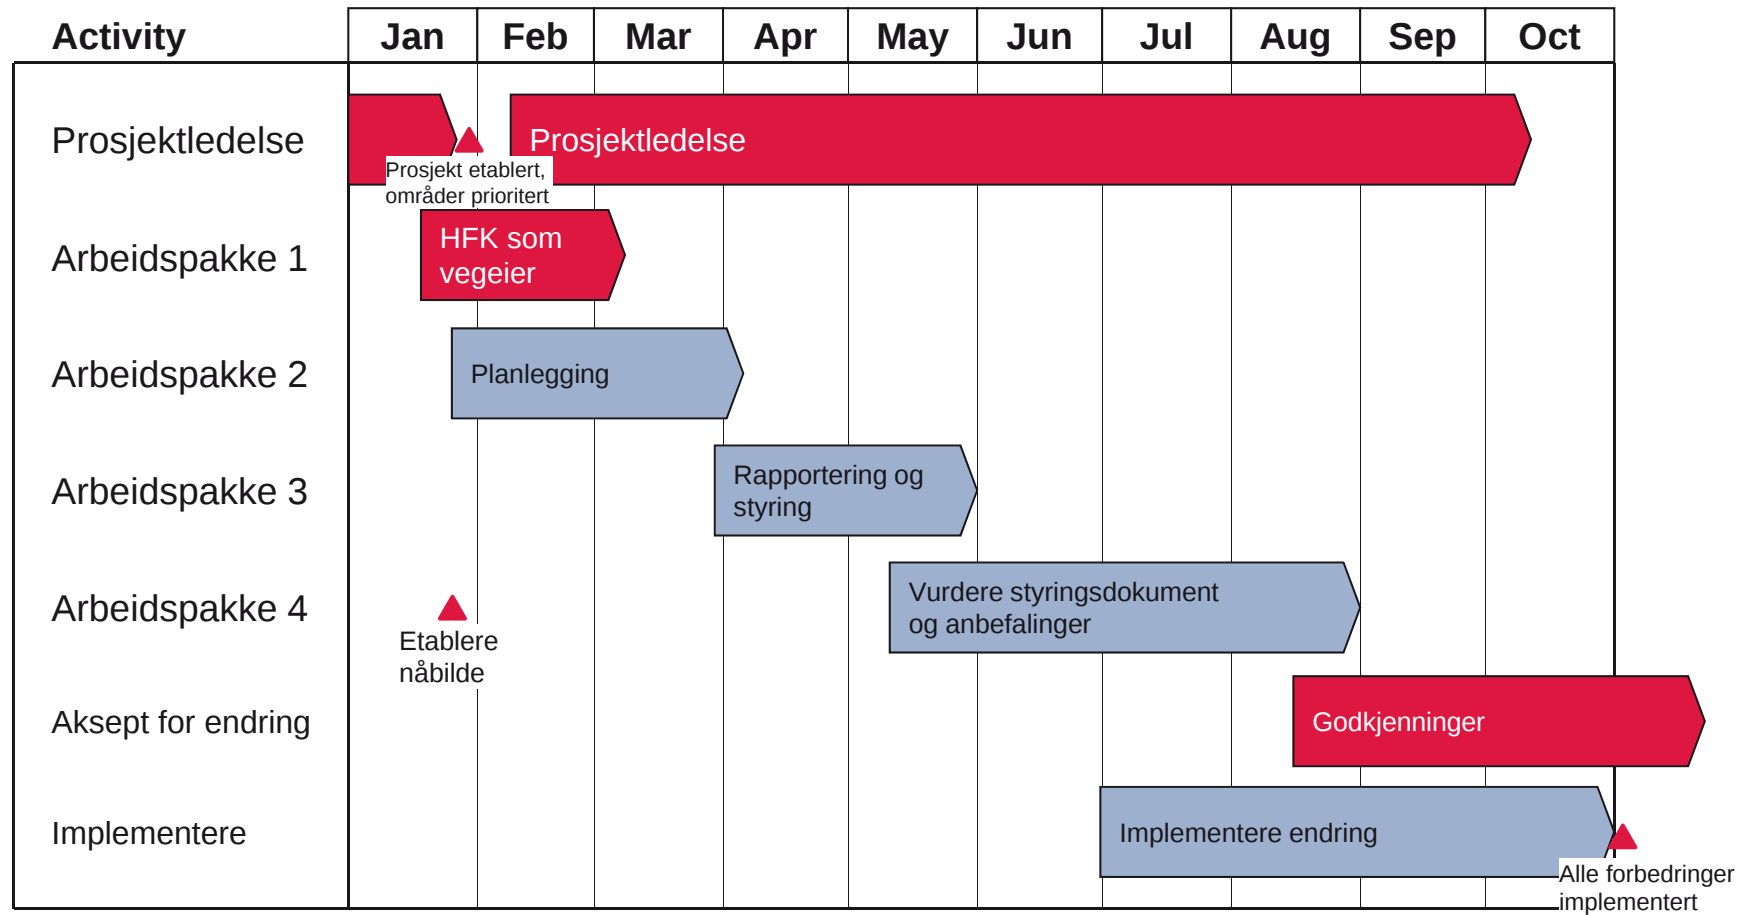

Resultat

- Resultat for kvar arbeidspakke
 - HFK som vegeiger
 - Overordna planlegging
 - Rapportering og styring
- Endringar i rammeavtalen
- Tiltak fra prosjektet
- Forbetra samhandling



Oppsummering resultat per arbeidspakke - Arbeidspakke 1: HFK som vegeiger

- Tettare på prioriterte prosjekter (kostnad, risiko, kvalitet, merksemd eller omfang)
 - Bompengepakkar
 - Store prosjekter
- Innføre styringsgrupper med klart mandat i alle bompengepakkar og store prosjekt
- Innføre faggrupper med mandat i alle programområde utanom Bergen der det er relevant
- Standardhevingstiltak; rapportering ved vesentlege avvik
- Meir systematisk kommunedialog
- Vidareutvikle fylkesvegrådet som arena for samhandling
- Sikre meir og riktig kompetanse

Oppsummering resultat per arbeidspakke - Arbeidspakke 2: Overordna planlegging



- HFK skal bli tydelegare på strategi i RTP
 - SVV skal inn i sekretariat for å sikre tettare samarbeid i planprosessen for RTP
 - Handlingsprogrammet skal rullerast med fast frekvens
 - Innspel frå kommunane vil skje gjennom regionråda i planprosessen og formell høyring
- Auka fokus på planlegging:
 - Tydeliggjere plandelen i Plan og byggeprogrammet (PBP)
 - Etablere eigne prosessar for plandelen og byggjedelen i PBP utanom Bergen




Oppsummering resultater per arbeidspakke - Arbeidspakke 3: Styring og rapportering

- Årshjul for rapportering er oppdatert, fristar oppdaterast årleg
- Tertialrapportane er betra
- Innføre rapportering av akkumulert forbruk for fleirårige prosjekt
- Innføre forenkla sluttrapportering til HFK for prosjekt over 10 million kr
- Betre samsvar mellom teknisk og økonomisk avslutning av prosjekt for å ha færre opne prosjekt i Hordaland

Måned	Frist	Hva	Fra hvem	Til
Januar	ultimo	Avstemming Regnskap	SVV	Fylkeskassen
Januar	ultimo	Belønningsordninger	SVV/HFK/BK	Samf. dep
Januar	ultimo	Kollektivmeldingen	SVV	Samferdsel/HFK
Februar	02.feb	Budsjettjustering	SVV	HFK
Februar	15.feb	Årsrapport (3.tertial)	SVV	HFK
Februar	15.feb	Årsmelding Hordaland	SVV	HFK
Februar	15.feb	KOSTRA rapportering	SVV	HFK
Mars	01.mar	Årsmelding fylkesveger Hordaland	SVV	HFK / VS
Mars	primo	Avstemme midler til Bybanen	Økonomi	SVV
April	primo	Rekvisisjonsplan	SVV	HFK / VS
April	medio	Årsmelding Bergensprogrammet	HFK/SVV/BK	Bergensprog
April	ultimo	Budsjett kommende år	Økonomi HFK VS/SVV	
April		Avstemme overførte bompenger	SVV	HFK
April	medio	Oppdaterte TS måltall, oppdaterte tall hver måned på ulykkesstatistikk	SVV/ITS	HFK / VS
April	30. apr	Årsmelding vegger utanom Bergen	Vegseksjoner	HFK
Mai	05. mai	Tertialrapport 1	SVV	HFK
Mai	05. mai	Budsjettjustering	SVV	HFK
Mai	medio	Rekvirerte forskudd/tilskudd	HFK / VS	SVV
Juni	medio	Tilbakemelding på årsrapport	HFK / VS	SVV
Juni	medio	Prosjektregnskap for flerårige prosjekter	SVV	HFK
Juni	medio	Avstemme midler til Bybanen	Økonomi HFK	SVV
August	15. aug	Ulykkesbarometer for Hordaland	SVV	HFK
August	medio	Refusjoner forskutteringer	HFK / VS	SVV
September	01. sep	Innspill til budsjett kommende år	SVV	HFK Økonomi/VS
September	04. sep	Tertialrapport 2	SVV	HFK
September	04. sep	Budsjettjusteringer	SVV	HFK
Oktober	medio	Rekvisisjonsplan	SVV	HFK / VS
Oktober	medio	Oppdatert Leveranseavtale	HFK / VS	SVV
Oktober	medio	Oppdaterte innspill til budsjett kommende år	SVV	HFK Økonomi/VS
Oktober	20. okt	Plan og Byggeprogram	SVV	HFK
Oktober	medio	Avstemme midler til Bybanen	Økonomi HFK	SVV
November	01. nov	Rentekompensasjon	SVV	HFK / VS
November	medio	Avstemme fylkesvegrekneskapen	Økonomi	SVV / VS
November	medio	Rekvirerte forskudd/tilskudd	HFK / VS	SVV
Desember	09. des	Budsjett og økonomiplan for kommende år	HFK / VS	SVV
Desember	20. des	Leveranseavtale kommende år	HFK / VS	SVV

Resultat arbeidspakke 4

- Endringar rammeavtalen

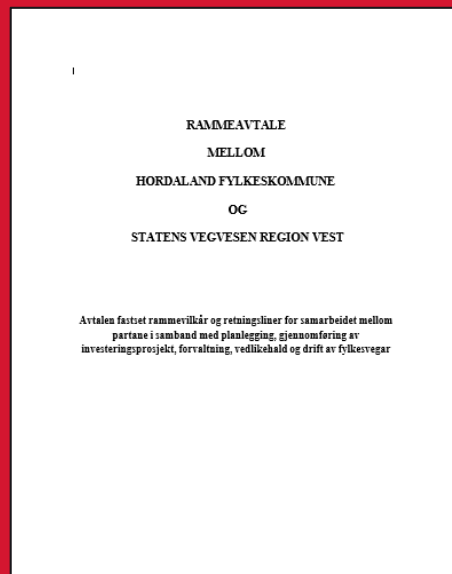

Overordna bilete

Det er gjort rundt 80* små og store endringar frå gamal til ny rammeavtale:

- Ca.20 i rammeavtalen
- Ca.10 i rolle og oppgåvedelinga
- Ca.50 i fullmaktsmatrixa

*Omtrentlege tal fordi nokre endringar vil vere overlappende. Ei endring i rammeavtalen er også reflektert i fullmaktsmatrixa

Område	G	Ny	Gap
Generelt			Gamle referansor til forvaltningreformar som vert gjort gjeldande frå 1. januar 2010 er tatt bort. Flere referer i den gamle rammeavtalen vi ser man til forvaltningreformar som er mange rutiner man ønsker å opprette som følge av denne. Disse er nå på plass, så alle slike referansor er fjernet.
Generelt			Vedlegg 3: RAPPORT Arbeidsgruppe rekruttering rapporteringssystem SVU - FK er tatt bort da denne ikke lenger er aktuell.
Rolle og oppgåvedeling	4	4	Denne listen er startrett identisk, men den er oppdatert med de uttrykk man benytter nå. Listen refererer til innhold i vedlegg 1: Rolle og oppgåvedeling.
Samr. Veq-administrasjon	5.1	5.1	Brøtlisten er utvidet og presisert. Listen er utvidet og presisert i punkt 6: Overordna planleggning og leilng.
Samr. Veq-administrasjon	5.1	5.1	I Sagn Og Fjerdane fylkeskommune har man satt av en konkret antall årsverk for å arbeide med Samr. veq-administrasjon. Det er et ønske at FVR dirketorer om dette når skal gjøres i Hordaland.
Finansiering av drift og	5.2	5.2	Ny tekst er lagt og farket og farket på drift og vedlikehold.
Finansiering av investeringer	5.3	5.3	Endring. Overføring av mindre bruk og prosjekt. Fullmakt til å inngå flerårig kontrakt er lagt til.
Generelle regler	5.4	5.4	Presisert at varentlige avvik skal rapporteres i FVR, samt i tertialrapportene. Varentlige avvik er definert.
Kontrakter for investeringer	6.2	6.2.1	Avnittet er utvidet og presisert. Fullmakten er fremdeles på 250 mnak
Funksjonskontrakter	6.2	6.2.2	Endret til kontrakter for drift og vedlikehold. Utvidet med funksjoner for fullmakten, og et ønske fra HFK om orientering.
Kjøp og sal av eiendom	6.3	6.3	Endret ordlyd.
Erstatning utanfor kontrakt og avkall på krav	6.4	6.4	Økt fullmakt til 3 mnak
Andre fullmakter	7	7	Lagt til tre fullmakter: Fråvik fra veq-nomal Delegation i planer og Inspeksjoner etter tunellikkerheitefarkrifta
Styring	-	8	Lagt til et nytt kapittel som omhandler styring av bompengopakker og andre prosjekt.
Reknekapprinn	8.1	8.3	Tatt bort henvisning til arbeidsgruppe fra 2010
Rapportering (tidligere)	9	9	Avnittet rapportering er oppdatert i forhold til dagens praksis.
Rapportering (tidligere Oppfølging)	9	9	Avnittet oppfølging er oppdatert med at FVR kan fungere som et oppfølgingsteam etter tertialrapportene. Krav om
Sluttrapporter	-	9.3	Nytt avnitt som beskriver ny praksis om sluttrapportering på prosjekt over 10 mnak.
Leveranseavtale	-	9.4	Nytt avnitt som beskriver oppdatering av leveranseavtalen og krav til rapportering ihht årshjul
Årsmelding	9.2	9.6	Denne avnittet er endret og oppdatert etter ny praksis. Årsmelding er tydeligere skilt fra årssjapp.
Andre rapportering	-	9.7	Henviser til årshjul for annen rapportering om sam og prosjekt i kapittelet for øvrig.
Endringer i avtalen	10	10	Ingen endring
Avtalolenge	11	11	Ingen endring
Vedlegg 1: Rolle og oppgåvedeling mellom			
Bakgrunn	13.1	13.1	Bakgrunn: Denne delen er kuttet betydelig ned da mye av innholdet var prarasam omhandlet forvaltningreformar fra 2010. Funksjonen er utvidet med programområde
Avklaring av begrep	13.2	-	Tatt bort. Ikke lenger relevant.
Informasjon om drift og vedlikehold	13.3	13.2	Slanket og generalisert.
Ekstern kontakt	Matrixe rad 1	Matrixe rad 1	Lagt til: Samferdselsvedlegg i HFK skal alltid informeres om mater på politisk nivå, i forkant av møte. Dette gjelder også mater som potensielt gir stor økonomisk konsekvens.
Planleggning	Matrixe rad 2	Matrixe rad 2	Lagt inn RTP som 12 årig plan (4+8). Presisert at SVU fremkoffer faellig grunnlag, HFK farket. Når det gjelder Plan og byqqoprogram er det presisert at HFK når skal gi føringer til dette.
Budsjettarbeid	Matrixe rad 3	Matrixe rad 3	For drift fjernet da det ikke har noe med samarbeidet med SVU å gjøre.
Leveranseavtale	-	Matrixe rad 4	Ny oppgave. Prædedyre vil bli lagt.
Investeringstiltak	Matrixe	Matrixe	Endret navn fra Utbygging

Viktigaste endringar – styring og rapportering

- Lagt inn nye rammer for styring av
 - Bompengepakkar
 - Store prosjekt
- Del om rapportering er utvida og presisert
 - Sluttrapportar
 - Akkumulert forbruk ved fleirårige prosjekt
 - Presisert vesentleg avvik
- Innføring av leveranseavtale og årshjul

Viktigaste endringar – planlegging

- Regional transportplan 4+8 år
- HFK gjev føringar til plandelen av Plan- og byggeprogram
- Ny prosedyre for etablering og oppdatering av Leveranseavtalen

Viktigaste endringar – fullmakter

- Endra tabellstruktur
 - Samla relevante fullmakter i eigne tabellar
 - Ny kolonne for lovheimel
- Nye fullmakter:
 - Fullmakt til å tvangsfullbyrde skjønn eller forhåndstiltredelse - Rettskraftig skjønn eller tillatelse etter oreigningsloven § 25.
 - Fullmakt til å bekrefte eierforhold til veggrunn ved egenerklæring - Tinglysingsloven § 38b
 - Fullmakt til å ivareta fylkeskommunens interesser i KOFA i anskaffelser foretatt på vegne av fylkeskommune.
 - Fullmakt til å forlenge foreldelsesfrist samt frafalle foreldelsesinnsigelse
 - Fullmakt til å avvise/avslå ethvert krav på erstatning når man mener at betingelsene for erstatning ikke er til stede.

Viktigaste endringer – fullmakter

- Nye «andre» fullmakter:
 - Fråvik frå vegnormal
 - Delegasjon i plansaker
 - Oppgåver etter tunellsikkerheitsforskrifta
- Erstatning utanfor kontrakt og avkall på krav → foreslått økt til 3 mnok

Resultat

- Forvaltningsrevisjon

Forvaltningsrevisjon av 2012

Forvaltningsrevisjonen «Samhandling på vegområdet», skrevet av Deloitte, ble framlagt oktober 2012 tilråda følgende punkter (*utdrag frå HFK's svar i grå kursiv*):

1. Formaliserte prosjektspesifikke møte for oppfølging av investeringsprosjekt.
Eigerstyremøter for store prosjekt og styringsgrupper for bompengepakker er etablert.
2. Nettbasert system for dokumentdeling
eRoom vil bli implementert som samarbeidsplattform for HFK og SVV, både i Fylkesvegrådet og andre fora. Nettbaserte system for deling er allerede tatt i bruk andre det er aktuelt.
3. Formaliserte rutinar for den årlege evalueringa av rammeavtalen
Rammeavtalen er gjennomgått og betra som en del av prosjektet, og skal evaluerast årleg. Det er nytta underlag frå andre fylkeskommunar i dette arbeidet.
4. Utarbeide praktiske rutinar for å handtere nye krav til budsjettering og rekneskapsføring
Økonomiavdelinga i Hordaland fylkeskommune har handtert dei nye krava til budsjettering for budsjettet for 2013 i samarbeid med SVV og vegseksjonen. SVV skal oversenda (per sommar 2015) eit samla oversyn over medgatte kostnader for alle prosjekt som ikkje er ferdigstilt. I tillegg arbeider dei med å få til eit opplegg for prosjektrapportering. Dette er også ein del av SIV-prosjektet, der mellom anna prosjektrekneskap og rapportering for vegprosjekta er tema.

Resultat

- «Produkter»

Nytt årshjul

Det er etablert eit «årshjul» som viser alle faste overleveringar mellom HFK og SVV. Årshjulet skal oppdaterast med nye datoar så snart som mogleg etter at den politiske kalenderen i HFK er publisert for kommande år.

Årshjulet vil vere eit vedlegg til leveranseavtalen, og inneheldt også ein oversikt over samhandlingsarenaer.

Måned	Frist	Hva	Fra hvem	Til	Kommentar
Januar	ultimo	Avstemming Regnskap	SVV	Fylkeskassen	Møte. Fylkeskassen, SVV, VS og Økonomi
Januar	ultimo	Belønningsordninger	SVV/HFK/BK	Samf.dep	Rapportering til Samferdselsdepartementet på Belønningsordninger Bergensprogrammet
Januar	ultimo	Kollektivmeldingen	SVV	Samferdsel HFK	Nøkkeltall til Kollektivmelding
Februar	02.feb	Budsjettjustering	SVV	HFK	Endringer i budsjett til marstinget
Februar	15.feb	Årsrapport (3.tertial)	SVV	HFK	Vegseksjonen sender til Økonomi
Februar	15.feb	Årsmelding Hordaland	SVV	HFK	SVV rapporterer nøkkeltall til Årsmeldingen, VS sender vidare opp i HFK
Februar	15.feb	KOSTRA rapportering	SVV	HFK	SVV rapporterer nøkkeltall til KOSTRA, VS sender vidare opp i HFK
Mars	01.mar	Årsmelding fylkesveger Hordaland	SVV	HFK / VS	Input til Årsmelding veger utanom Bergen
Mars	primo	Avstemme midler til Bybanen	Økonomi	SVV	Rapportere forbruk av bompenger for Bybanen
April	primo	Rekvisisjonsplan	SVV	HFK / VS	Forskudd/tilskudd
April	medio	Årsmelding Bergensprogrammet	HFK/SVV/BK	Bergensprog	Utkast til årsmelding legges frem for styringsgruppe. Koordineres av kommunikasjonsgruppen i Bergensprogrammet. Sak til junitinget, først gjennom SAMU og FU
April	ultimo	Budsjett kommende år	Økonomi HFK	VS/SVV	Første møte for å sette rammer for kommende års budsjett.
April		Avstemme overførte bompenger	SVV	HFK	Samlet oversikt over inntektene i bompengepakken
April	medio	Oppdaterte TS måltall, oppdaterte tall hver måned på ulykkesstatistikk	SVV/TS	HFK / VS	
April	30.apr	Årsmelding veger utanom Bergen	Vegseksjonen	HFK	Sak til junitinget, først gjennom SAMU og FU
Mai	05.mai	Tertialrapport 1	SVV	HFK	
Mai	05.mai	Budsjettjustering	SVV	HFK	Endringer i budsjett til junitinget
Mai	medio	Rekvirerte forskudd/tilskudd	HFK / VS	SVV	
Juni	medio	Tilbakemelding på årsrapport	HFK / VS	SVV	
Juni	medio	Prosjektregnskap for flerårige prosjekter	SVV	HFK	Akkumulerte tall og prognoser
Juni	medio	Avstemme midler til Bybanen	Økonomi HFK	SVV	Rapportere forbruk av bompenger for Bybanen
August	15.aug	Ulykkesbarometer for Hordaland	SVV	HFK	
August	medio	Refusjoner forskutteringer	HFK / VS	SVV	
September	01.sep	Innspill til budsjett kommende år	SVV	HFK Økonomi/VS	Prosatekst, pågående og nye prosjekt
September	04.sep	Tertialrapport 2	SVV	HFK	
September	04.sep	Budsjettjusteringer	SVV	HFK	Endringer i budsjett til oktoberinget
Oktober	medio	Rekvisisjonsplan	SVV	HFK / VS	Forskudd/tilskudd
Oktober	medio	Oppdatert Leveranseavtale	HFK / VS	SVV	Evt endringer på bakgrunn av justert budsjett
Oktober	medio	Oppdaterte innspill til budsjett kommende år	SVV	HFK Økonomi/VS	Prosatekst, pågående og nye prosjekt
Oktober	20.okt	Plan og Byggeprogram	SVV	HFK	Endelig godkjenning i desemberinget
Oktober	medio	Avstemme midler til Bybanen	Økonomi HFK	SVV	Rapportere forbruk av bompenger for Bybanen
November	01.nov	Rentekompensasjon	SVV	HFK / VS	HFK / VS sender vidare til departementet
November	medio	Avstemme fylkesvegrekneskapen	Økonomi	SVV / VS	Møte
November	medio	Rekvirerte forskudd/tilskudd	HFK / VS	SVV	
Desember	09.des	Budsjett og økonomiplan for kommende år	HFK / VS	SVV	Vedtak i Fylkestinget
Desember	20.des	Leveranseavtale kommende år	HFK / VS	SVV	



Malverk

- Det er utvikla malar for programområde, store prosjekt, samt nye og reviderte bompengepakkar.



Grove prosessar for RTP, samt tidslinje for Plan og byggeprogram utanom Bergen

Utarbeide Regional Transportplan (RTP)

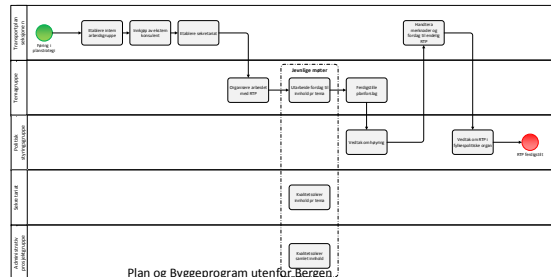

Handlingsplan

Det er utarbeidd ein handlingsplan som viser status og ansvar på aksjonar som er beslutta i prosjektet. Denne planen skal følgjast opp i samhandlingsmøte til alle aksjonar er kvittert ut.

ID	Område	Aksjon	Ansvar	Person(er)	Frist	Status
1	1. Nytt utkast til styringsdokumenter etablert a. Rammeavtale b. Vedlegg: Rolle- og oppgavedeling c. Vedlegg: Fullmaktsmatrise	1.Ferdigstille ny rammeavtale med vedlegg 2.Rammeavtalen med vedlegg må godkjennes i FVR, SAMU og Fylkesting 8.des. Må så signeres på direktørnivå.	HFK	1.Dan 2.John Martin	1. 1.10 2.Må være ferdig 26.10	Under arbeid
2	2. Forenkle og effektivisere prosessen rundt etablering og oppdatering av leveranseavtalen	Etablere og godkjenne prosedyre for dette	SVV	Stab SVV (Beate) - Helge	01.okt	Under arbeid
3	3. RTP skal bli tydelegare på strategi a. SVV skal inn i sekretariat for å sikre tettare samarbeid i planprosessen for RTP b. Handlingsprogrammet til RTP skal rullerast med fast frekvens (RTP 4+8 år) c. Innspel frå kommunane til RTP-prosessen vil skje gjennom regionrådene i planprosessen og formell høring	a: Gjennomført b: Frekvens må besluttes, evt bli stående. Rulleres hvert 4. år. c: Leder sekretariat er ansvarlig for gjennomføring av dette.	HFK	b: John Martin c: Marte	b: 1.okt c: i henhold til RTP prosess	Ferdig
4	4. Økt fokus på planlegging av prosjekter som er listet i RTP: a. Tydeliggjøre plandelen i Plan og byggeprogrammet (PBP) b. Etablere egne prosesser for plandelen og byggedelen i PBP utenfor Bergen	a: Fortløpende b: Utført	HFK	John Martin		Ferdig
5	5. Tettare på prioriterte prosjekter (kostnad, risiko, kvalitet, oppmerksomhet eller omfang) a. Bompengepakker b. Store prosjekter c. Innføre mandat for styring i alle nye bompengepakker og store prosjekt	a: Etablering av styringsgruppe i alle nye og reviderte bompengepakker b: Definere hvilke konkrete prosjekter som skal defineres som store prosjekt, og dermed styres ved eigerstyringsmøter. (Storskaret - Arefjord er definert) c:Forslag til mandat er utarbeidet. Disse må gjennomgås i FVR.	HFK	a: John Martin b: John Martin c: John Martin/Thorbjørn (bompengepakker) John Martin (Store prosjekt)	a: Høst 2015 b: FVR 29.sep c: FVR 29.sep	Under arbeid
6	6. Innføre faggrupper med mandat i aktuelle programområder utenom Bergen	1: Forslag til mandat for kollektiv er utarbeidet. Disse må gjennomgås i FVR 2: Innføre faggruppe med mandat for TS	HFK	1: John Martin, Inge Lise 2: Lise	1: FVR: 29.sep 2: 1.des	Under arbeid
7	7. Sikre rapportering ved vesentlige avvik på standardhevingstiltak	Rapportere ved vesentlige avvik	SVV	Stab SVV	Løpende	Ferdig
8	8. For å sikre meir rasjonell og føreseielig gjennomføring av tiltak innen standardheving og programområde, skal man i større grad enn i dag inngå fleirårige kontraktar.	Avklare om dette må godkjennes som en ny fullmakt i Fylkestinget. 25.september: Dette er ikke en ny fullmakt.	HFK	John Martin	26.okt	Ferdig
9	9. Mer systematisk kommunedialog a: Kontaktmøter i HFK/SVV regi b: Initiert fra kommunene	a: Må utarbeides en plan og agenda. B: Utarbeide matrise i rolle og oppgavetabellen	HFK	Lise	FVR: 29.sep	Ferdig
10	10. Årshjul for rapportering er oppdatert	Må oppdateres årlig og legges ved Leveranseavtalen	HFK	Lise og Beate	01.nov	Under arbeid
11	11. Tertialrapportene er forbeta	Endringer fra notat "Tilbakemelding tertialrapport" fra 19.08.2015 skal implementeres	SVV	Stab SVV	Årsrapport 2015	Under arbeid
12	12. Innføre rapportering av akkumulert forbruk for fleirårige prosjekt	Rapportene skal sendes HFK. På sikt bør dette integreres i vedlegg til tertialrapportene.	SVV	Stab SVV	01.okt.15	Under arbeid
13	13. Utarbeide enkel mal for økonomisk sluttreportering av prosjekter over 10 mill kr	Utarbeide mal	SVV	Stab SVV	01.des	Under arbeid
14	14. Betre samsvar mellom teknisk og økonomisk avslutning av prosjekt. Formål: Færre opne prosjekt. Ny «diversepost» på budsjettet.	Foreslå tiltak for å løse dette. Presentere statusmelding i FVR 11.des 2015	SVV	Stab SVV	11.des	Under arbeid
15	15. Vidareutvikle fylkesvegrådet som arena for samhandling	Kontinuerlig forbedring	HFK	Lise - alle deltakerer	Pågående	Under arbeid
16	16. Tidligere prosjektering for fremtidige tiltak	Egen post i Plan- og byggeprogrammet.	HFK	John Martin - utført	01.okt	Ferdig
17	17. Innføre eRoom som samhandlingsarena	Opprette område. Gi brukertilgang. Gjennomføre opplæring.	SVV	Stab SVV	01.okt	Under arbeid
18	18. Rullere strategi for drift- og vedlikehold	Lage plan for rullering av strategi	HFK	Lise	01.okt	Under arbeid
19	19. Retningslinjer for handsaming av fråvik frå vegnormalane	Svare på SVV's brev, og få dette inn i rammeavtalen.	HFK	Helge	Fullmakten må godkjennes 11.nov	Under arbeid
20	20. Innføre fast rapportering på trafikkulykker a: Månedlig rapport (drepte og hardt skadde) b: Ulykkesbarometer inn som fast rapportering i årshjulet	a: Månedlig rapport (drepte og hardt skadde) sendes Lise. b: Ulykkesbarometer inn som fast rapportering i årshjulet.	SVV	a: Stab SVV b: Utført	01.okt	Under arbeid
21	21. Dokumentere rutiner knytta til økonomi for fylkesveg - Oppfølging revisjonsrapport	Skriftleggjere prosessar/rutiner (spesielt med omsyn til økonomi/rekneskap) for fylkesveger	HFK	Bente - Erling	31.12.	Under arbeid

Resultater

- Samhandling

Sluttleveranse frå prosjektet

- Endra styringsdokumenter med vedlegg
- Prosjektrapport med vedlegg
- Liste over alle aksjonar med status
- Utarbeide underlag til vidare politisk og administrativ handsaming
- Svare ut forvaltningsrevisjonen frå 2012
- Prosessen i seg sjølv har vore nyttig for å skape ei betre forståing for rollene hjå SVV og HFK innan vegområde
