LAB Entreprenør AS

HARDANGERBADET
skisse Fremdrift prosjektrealisering

utarbeidet 20.03.17

| ID | Notater | Aktivitets | Aktivitetsnavn | Varighet | Start | Slutt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | **FORBEREDENDE FASE** | **1 dag** | **on 15.03.17** | **on 15.03.17** |
| 2 | HB | | Avsluttet forberedende fase | 1 dag | on 15.03.17 | on 15.03.17 |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | **FINANSIERING** | **279 dager** | **ma 16.01.17** | **to 01.03.18** |
| 5 | | | **Søknad om midlar** | **279 dager** | **ma 16.01.17** | **to 01.03.18** |
| 6 | HB | | Førehandsgodkjenning spelemidlar (godkjent pr 20./3-17) | 1 dag | ma 20.03.17 | ma 20.03.17 |
| 7 | HB | | Søknad spelemidlar Kvam herad | 1 dag | ma 04.12.17 | ma 04.12.17 |
| 8 | HB | | Gjensidige stiftelsen | 140 dager | fr 30.06.17 | to 01.02.18 |
| 9 | HB | | Sparebankstiftinga Hardanger | 66 dager | fr 31.03.17 | fr 30.06.17 |
| 10 | HB | | Kompensasjonsmidlar | 120 dager | ma 16.01.17 | fr 30.06.17 |
| 11 | HB | | Samarbeidande kommunar | 88 dager | on 01.03.17 | fr 30.06.17 |
| 12 | HB | | Sparebanken Vest m fleire | 66 dager | fr 31.03.17 | fr 30.06.17 |
| 13 | HB | | Thon stiftinga | 225 dager | fr 31.03.17 | to 01.03.18 |
| 14 | | | **Interessent-finansiering** | **1 dag** | **fr 30.06.17** | **fr 30.06.17** |
| 15 | HB | | HB KF | 1 dag | fr 30.06.17 | fr 30.06.17 |
| 16 | HB | | Hardangerbadet Eigedom (HBE) | 1 dag | fr 30.06.17 | fr 30.06.17 |
| 17 | HB | | Helsebanken | 1 dag | fr 30.06.17 | fr 30.06.17 |
| 18 | HB | | Hardangefjord Hotell (HFH) | 1 dag | fr 30.06.17 | fr 30.06.17 |
| 19 | HB | | Interessent avtalar | 1 dag | fr 30.06.17 | fr 30.06.17 |
| 20 | HB | | ***Sikra tilstrekkeleg finansiering*** | 1 dag | to 31.08.17 | to 31.08.17 |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | **UTVIKLING - PROSJEKTERING - BYGGING** | **558 dager** | **on 05.04.17** | **fr 14.06.19** |
| 23 | HB/LAB | | Signering Samarbeidsavtale HB / LAB | 1 dag | on 05.04.17 | on 05.04.17 |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | **FASE 1 - FORPROSJEKT** | **107 dager** | **ti 18.04.17** | **on 04.10.17** |
| 26 | HB/LAB | | Organisering og opprettelse av prosjektteam | 4 dager | ti 18.04.17 | fr 21.04.17 |
| 27 | HB/LAB | | **Utvikling av prosjekt** | **72 dager** | **ma 24.04.17** | **ti 22.08.17** |
| 28 | LAB | | Bearbeide funksjoner/brukerkrav/arealbehov/kvaliteter | 62 dager | ma 24.04.17 | ti 08.08.17 |
| 29 | LAB | | Undersøke/fastsette tekniske forutsetninger (VA/EL/Grunn, m.m.) | 30 dager | ma 24.04.17 | fr 02.06.17 |
| 30 | LAB | | Bygningsmessige og tekniske analyser inkl budsjettpris | 30 dager | on 21.06.17 | ti 22.08.17 |
| 31 | LAB | | Utarbeide detaljerte tidsplaner for prosjektering og bygging | 15 dager | on 02.08.17 | ti 22.08.17 |
| 32 | HB | | Beslutte Byggeprogramm/Forprosjekt | 1 dag | on 23.08.17 | on 23.08.17 |
| 33 | HB/LAB | | Utarbeide grunnlag og innsendelse av Rammesøknad | 10 dager | to 24.08.17 | on 06.09.17 |
| 34 | LAB | | Bindende fastpristilbud med m. funksjons og ytelsesbeskrivelser | 1 dag | to 14.09.17 | to 14.09.17 |
| 35 | HB | | Beslutte bygging | 1 dag | fr 29.09.17 | fr 29.09.17 |
| 36 | HB/LAB | | Kontraktsinngåelse totalentreprise (TE) | 1 dag | on 04.10.17 | on 04.10.17 |
| 37 | | | ***Forventet mottatt Rammetillatelse (søk+2mnd.)*** | 1 dag | to 02.11.17 | to 02.11.17 |
| 38 | | | | | | |
| 39 | | | **FASE 2 - KONTRAHERINGS- OG BYGGEFASE** | **442 dager** | **to 05.10.17** | **fr 14.06.19** |
| 40 | | | **Detaljprosjektering** | **300 dager** | **to 05.10.17** | **on 28.11.18** |
| 41 | LAB | | Detaljprosjektering av bygningsmessige og tekniske fag | 300 dager | to 05.10.17 | on 28.11.18 |
| 42 | LAB | | Utarbeide grunnlag for søknad om IG grunnarb. og råbygg | 23 dager | to 05.10.17 | ma 06.11.17 |
| 43 | LAB | | Utarbeide grunnlag for søknad om IG resterende arbeid/fag | 40 dager | ti 02.01.18 | ma 26.02.18 |
| 44 | LAB | | Forventet mottatt IG grunn/råbygg | 1 dag | on 15.11.17 | on 15.11.17 |
| 45 | LAB | | **Byggestart** | 1 dag | to 23.11.17 | to 23.11.17 |
| 46 | LAB | | **Bygging** | 395 dager | fr 24.11.17 | to 30.05.19 |
| 47 | LAB | | **Ferdigstillelse** | 1 dag | fr 31.05.19 | fr 31.05.19 |
| 48 | | | **Overlevering** | 1 dag | fr 14.06.19 | fr 14.06.19 |

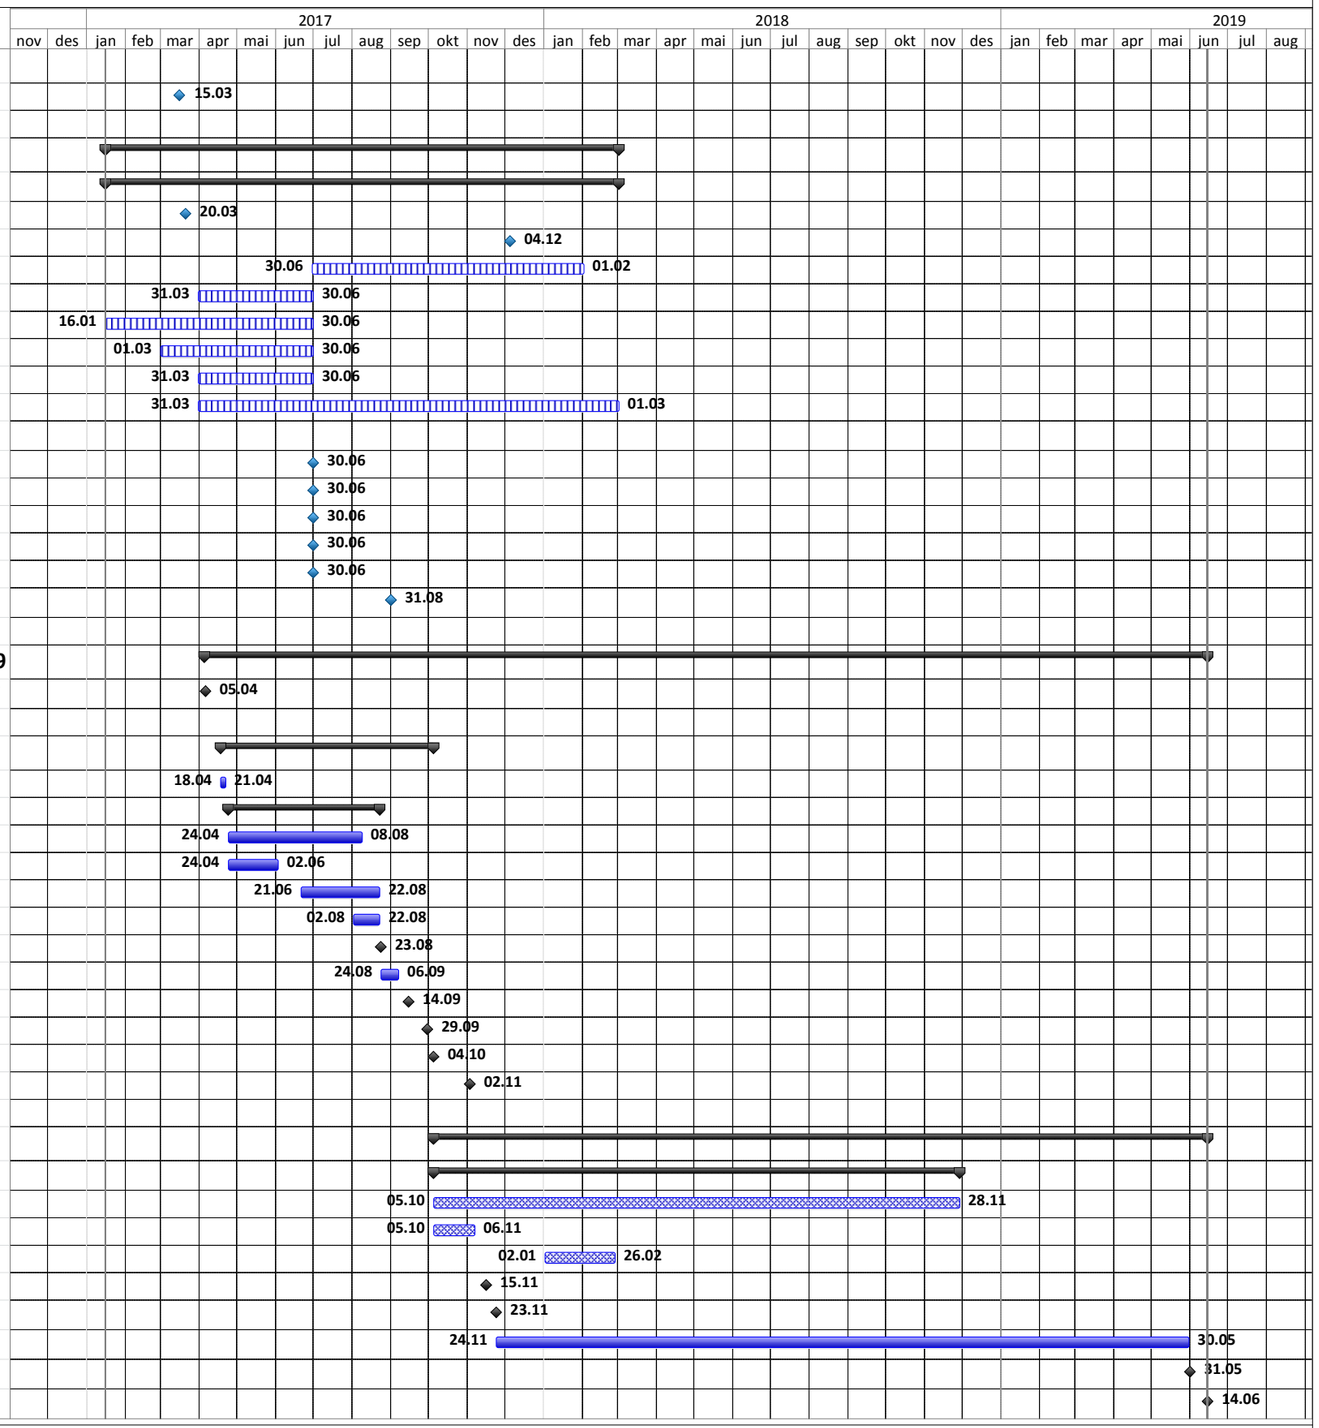


Prosjekt: Skisse fremdriftsplan 20.
Utskriftsdato: ti 21.03.17

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktivitet | | Grupper etter sammendrag | | Ekstern milepæl | | Bare varighet | | Tidsfrist | |
| Deling | | Fremhevet aktivitet | | Inaktiv aktivitet | | Manuell sammendragsfremheving | | Fremdrift | |
| Milepæl | | Fremhevet milepæl | | Inaktiv milepæl | | Manuelt sammendrag | | | |
| Sammendrag | | Fremhevet fremdrift | | Inaktivt sammendrag | | Bare start | | | |
| Prosjektsammendrag | | Eksterne aktiviteter | | Manuell aktivitet | | Bare slutt | | | |
